

**Курганный могильник Бесшатыр, VII-IV вв. до нашей эры  
(научно-реставрационные работы, Алматинская область)**

*Основные требования к научно-реставрационным работам по договору № 60 на выполнение государственного задания от «23» апреля 2021 г.*

- реставрационные работы камеры музея;
- реставрация наружной и внутренней лестницы;
- водоотводные работы смотровой площадки;
- укладка напольного покрытия смотровой площадки.

**Сметная стоимость научно-реставрационных работ 19 130 000 тенге.**

*Сумма выполненного объема с начало года: 19 130 000 тенге. (100 %)*

*На текущий период: 19 130 000 тенге (100 %)*

*Остаток: 0 тенге (0 %)*

**Научно-реставрационные работы.**

**В октябре-ноябре были выполнены** реставрационные работы смотровой площадки. Произведен набрызг декоративной штукатурки по оштукатуренной стене подпорной стены. В курганном могильнике были выполнены штукатурные работы с применением диких камней. Все стены и потолок окрашены. Пол засыпан местным грунтом. Все металлические лестницы и ступени очищены и окрашены.

**В акте приемки выполненных работ №1 за октябрь-ноябрь 2021 года (на текущий период) включены нижеследующие виды и объемы научно-реставрационных работ:**

- Реставрационные работы смотровой площадки
- Штукатурные работы подпорной стены с набрызгом – 283,7 м<sup>2</sup>
- Очистка и окраска металлоконструкции и ступеней лестницы подпорной стены
- Штукатурные работы внутренних стен курганного могильника с применением диких камней
- Штукатурные работы потолка с набрызгом – 180,93 м<sup>2</sup>
- Установка стенда облицовкой колонн


Предлагаем фотографий выполненных научно-реставрационных работ на объекте:

## Фотографии до выполнения реставрационных работ







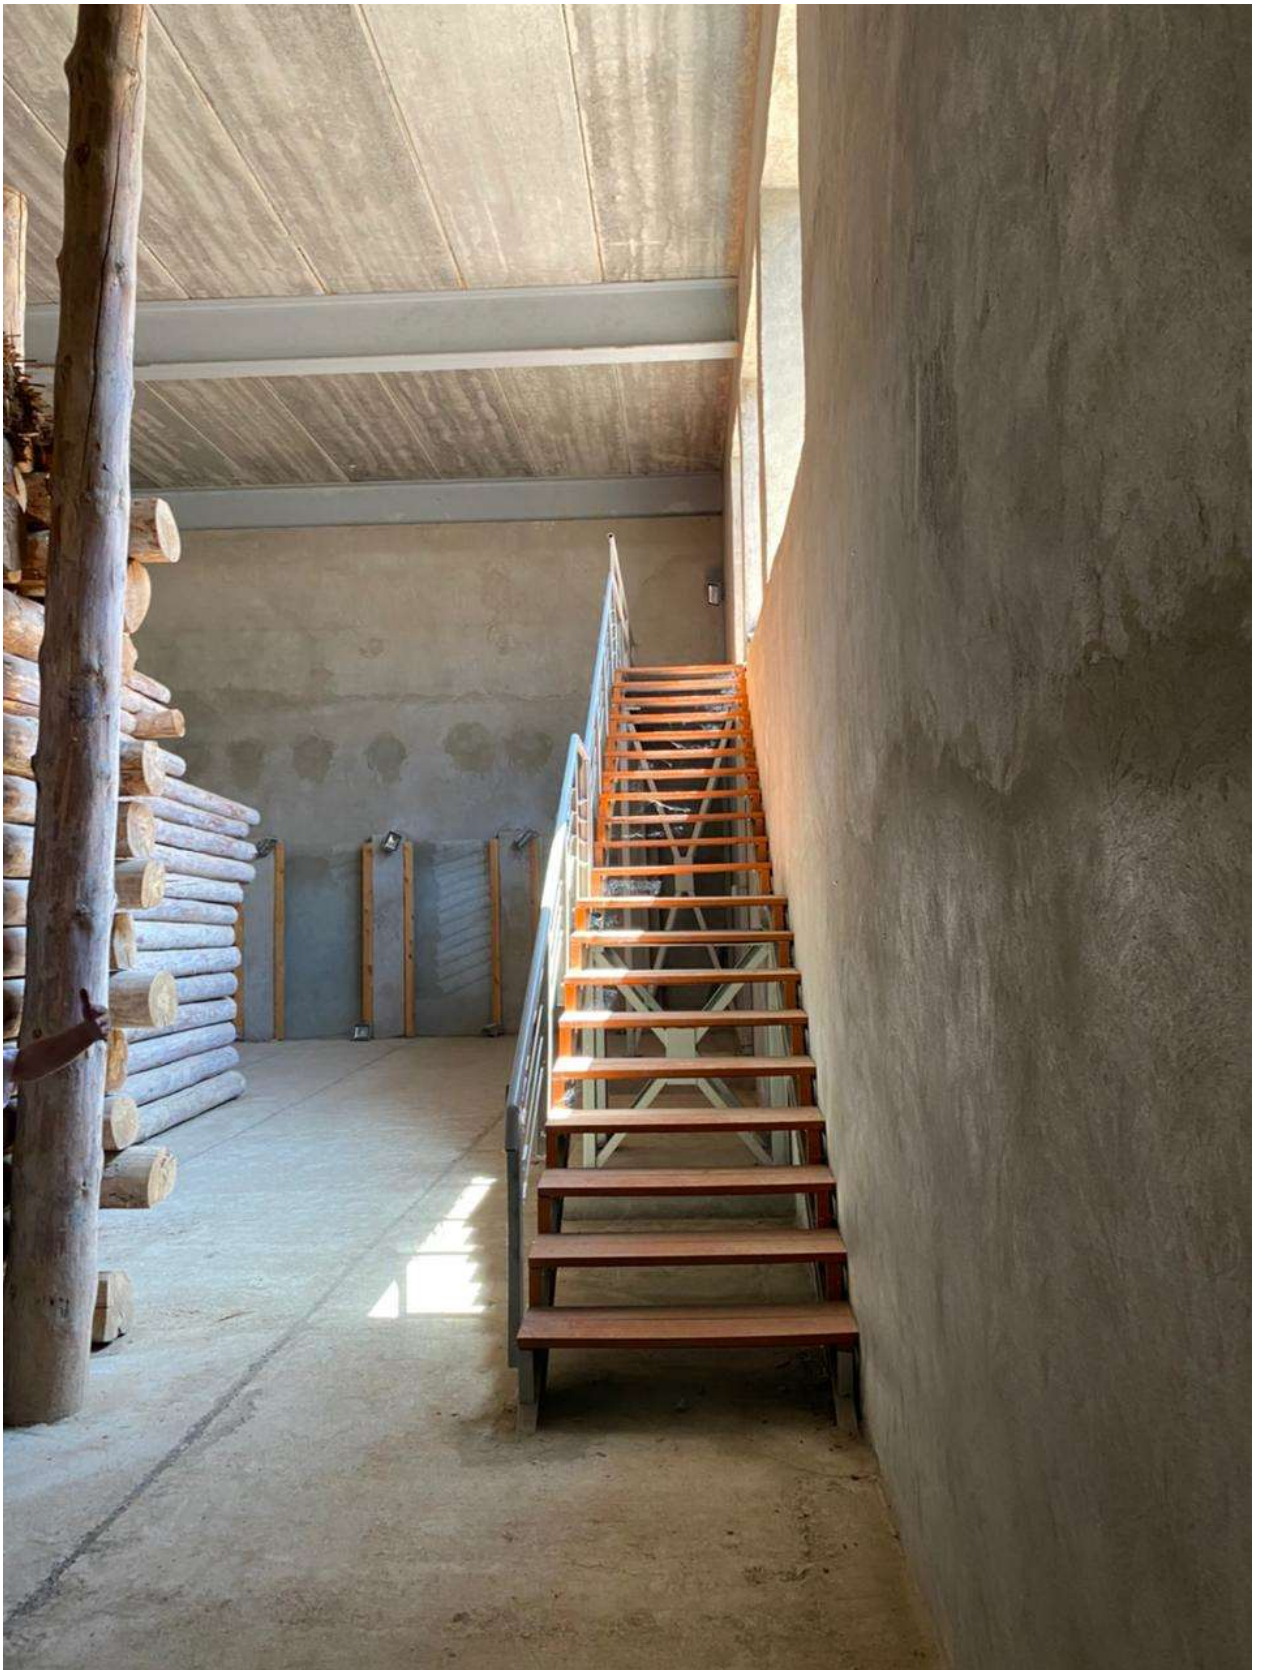


## Реставрационные работы камеры музея









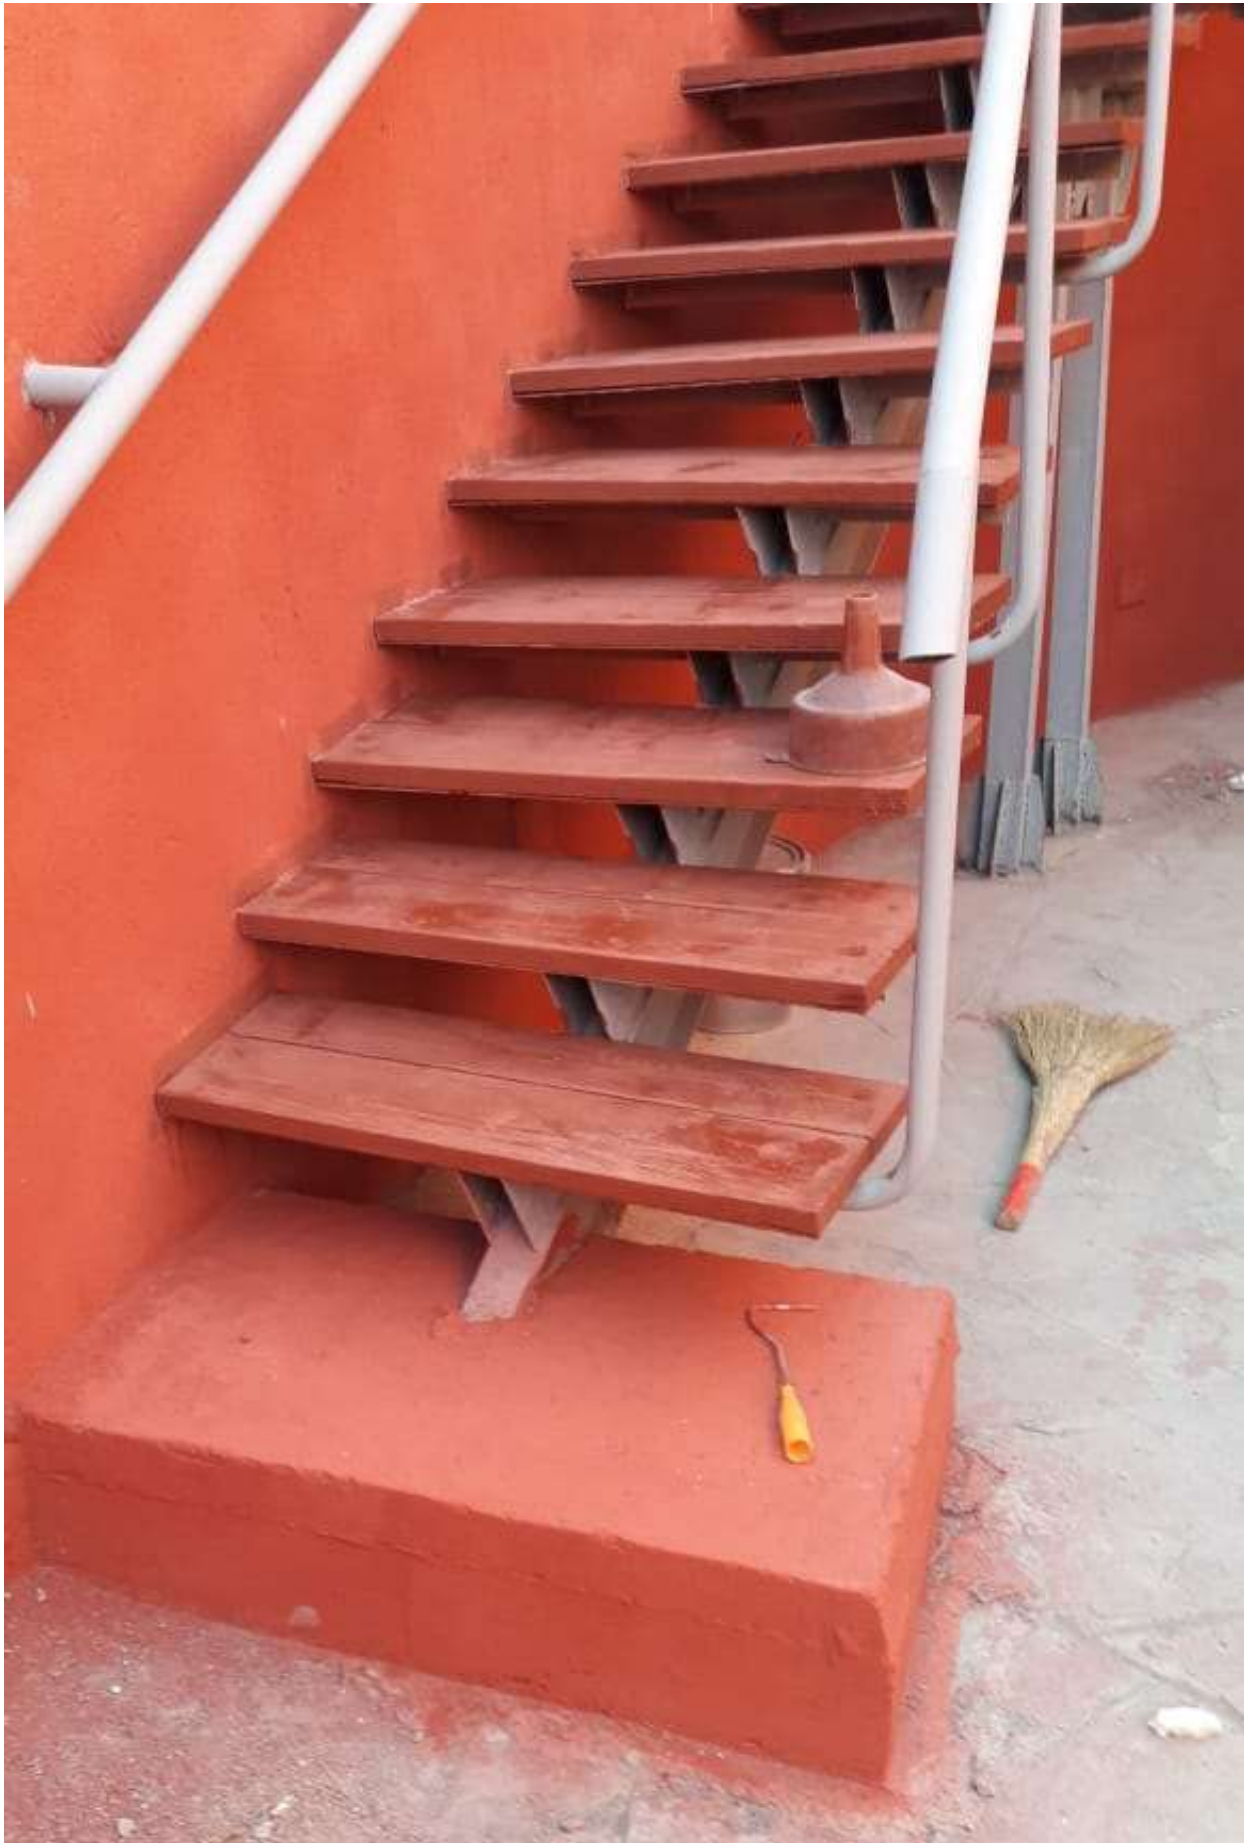




## **Водоотводные работы смотровой площадки.**



## **Укладка напольного покрытия смотровой площадки**



## Реставрация наружной лестницы

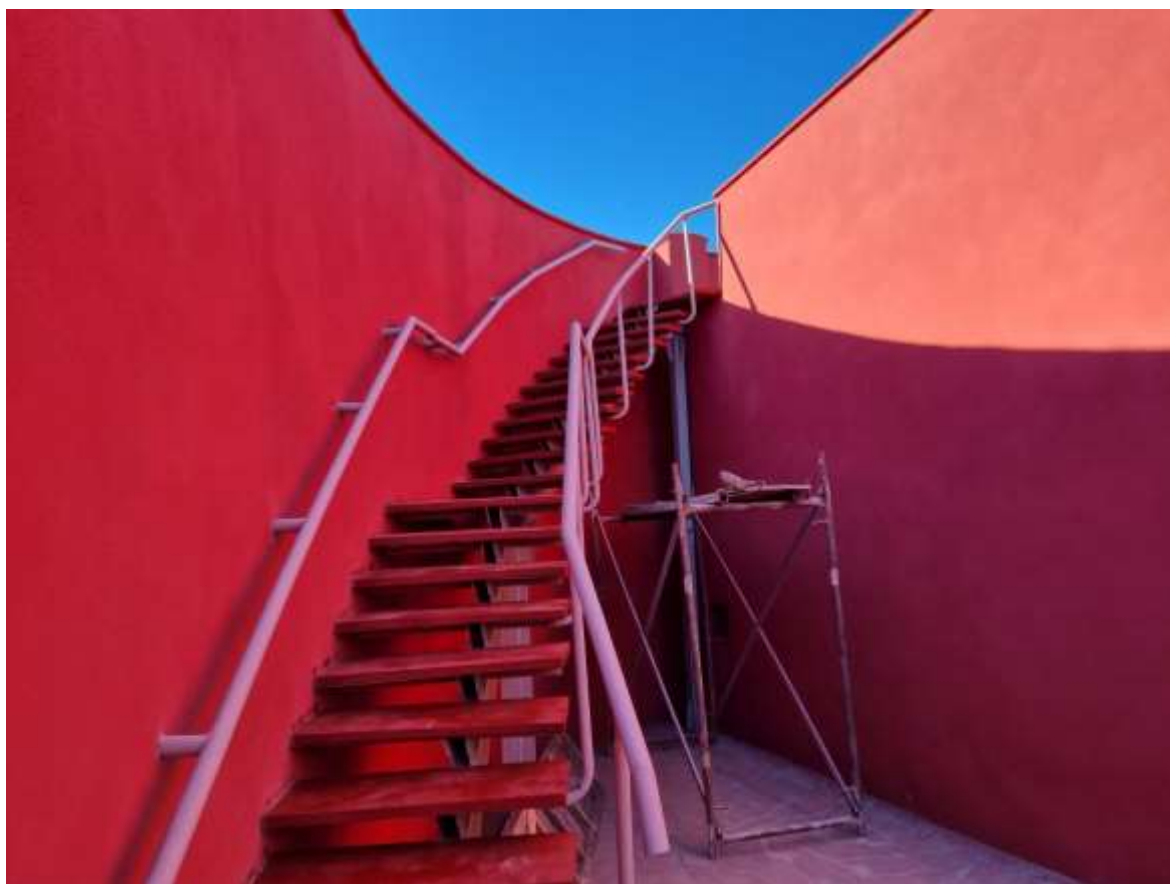







## Реставрация внутренней лестницы





**Бокей ордасы: Здание больницы  
(Мемориальный музей здравоохранения), 1852 г.  
(научно-реставрационные работы, Западно-Казахстанская область)  
Основные требования к научно-реставрационным работам по  
договору № 60 на выполнение государственного задания от «23» апреля 2021**

2.

- ремонтные работы кровли;
- устройство крыльца и козырька;
  - облицовка цоколя;
- обшивка наружных стен декоративными панелями;
- реставрационные работы интерьера.

**Сметная стоимость научно-реставрационных работ 24 060 000  
тенге.**

*Сумма выполненного объема с начало года: 0 тенге. (0 %)*

*На текущий период: 24 060 000 тенге (100 %)*

*Остаток: 0 тенге (0 %)*

**В акте приемки выполненных работ №1 за октябрь-ноябрь 2021  
года (на текущий период) включены нижеследующие виды и объемы  
научно-реставрационных работ:**

1. Демонтаж существующего покрытия крылец
2. Ремонт существующей стропильной системы
3. Покрытие кровли крылец из металлических листов
  4. Устройство декоративных подзоров
  5. Устройство бетонного основания крыльца
  6. Демонтаж деревянной обшивки стен
  7. Монтаж обшивки стен из блок хауза
  8. Замена оконных переплетов
  9. Замена наружных дверей
10. Ремонт штукатурки стен и потолка с окраской
  11. Демонтаж и монтаж деревянных полов
  12. Окрасочные работы
13. Электроснабжение внутренних помещений
14. Устройство системы отопления




## Обшивка наружных стен декоративными панелями






● ○ REDMI NOTE 8  
∞ AI QUAD CAMERA

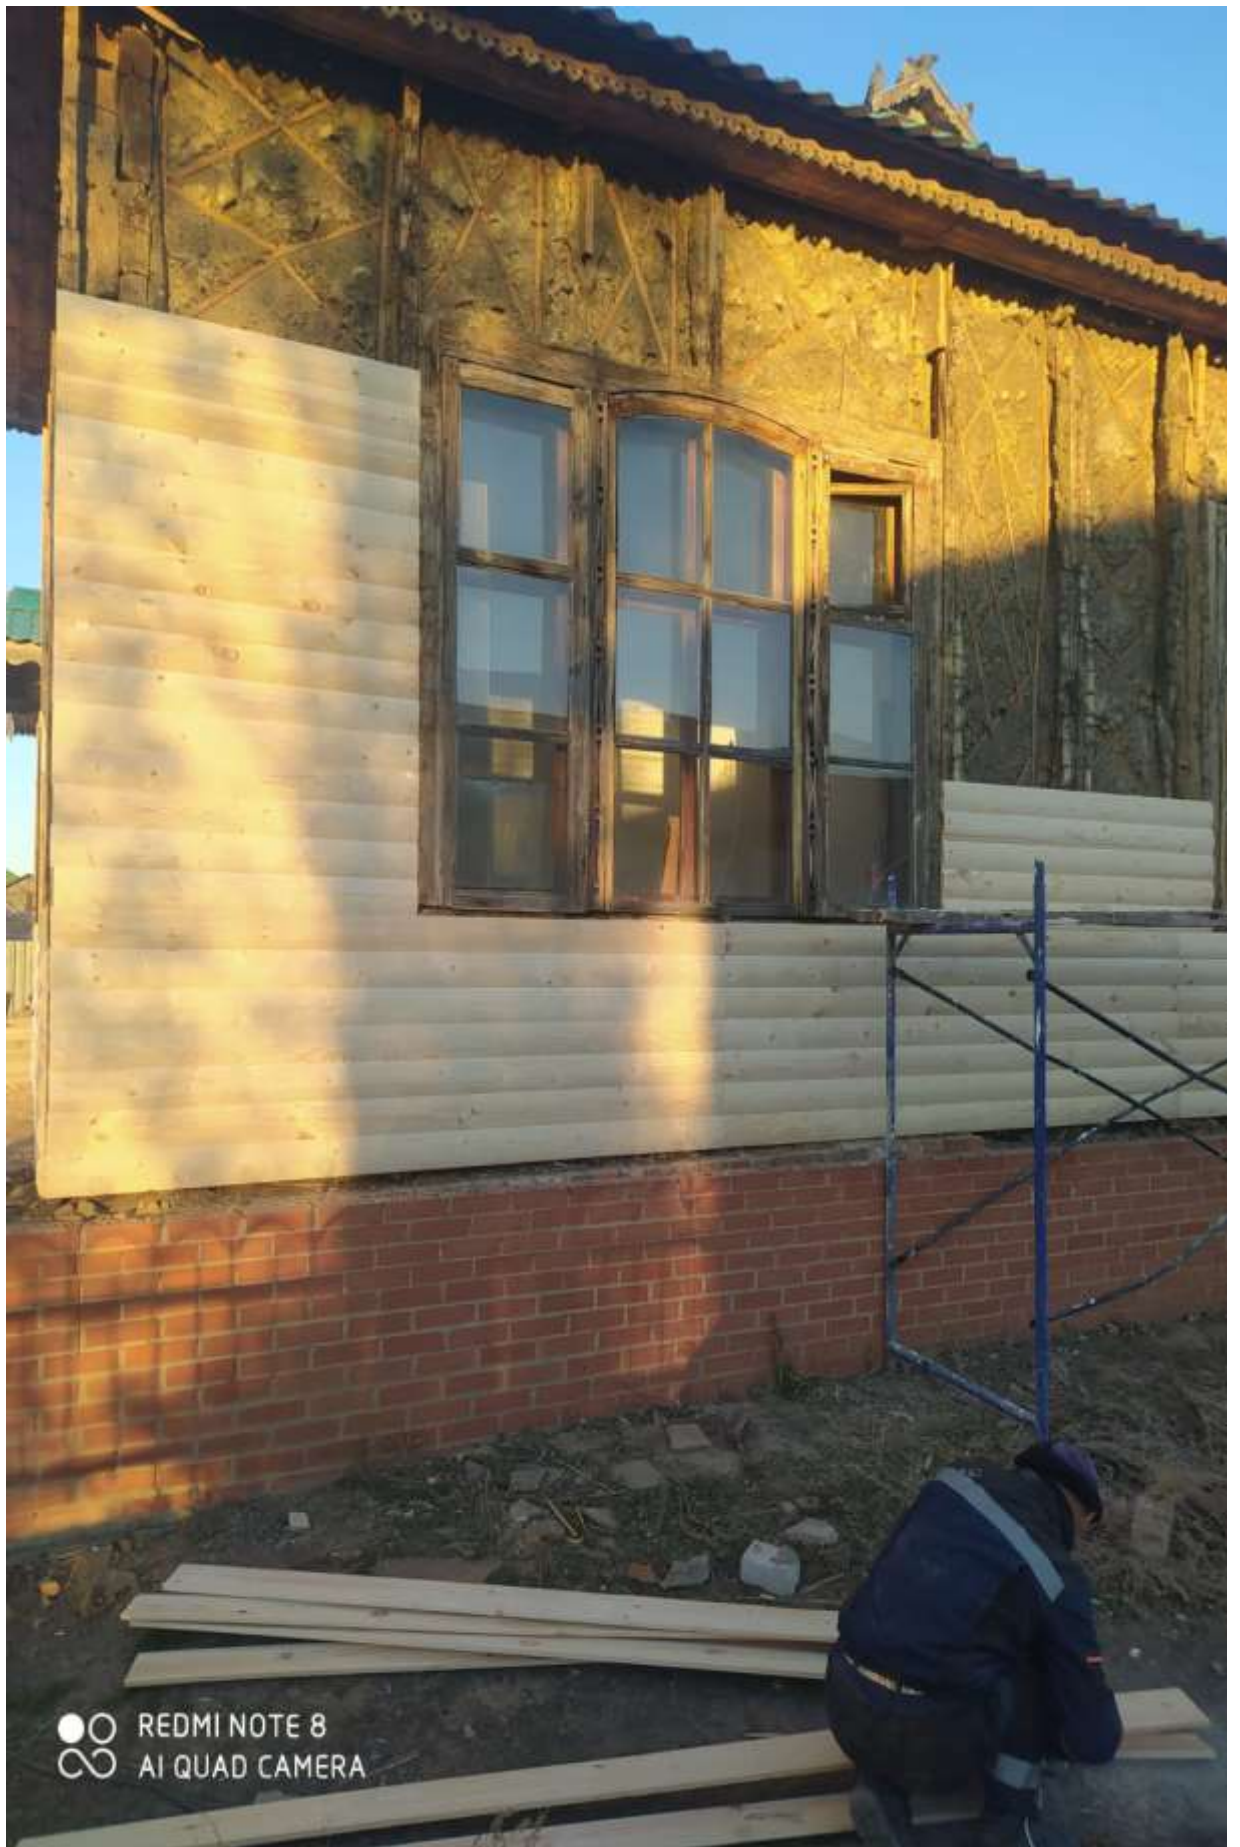

● ○ REDMI NOTE 8  
∞ AI QUAD CAMERA

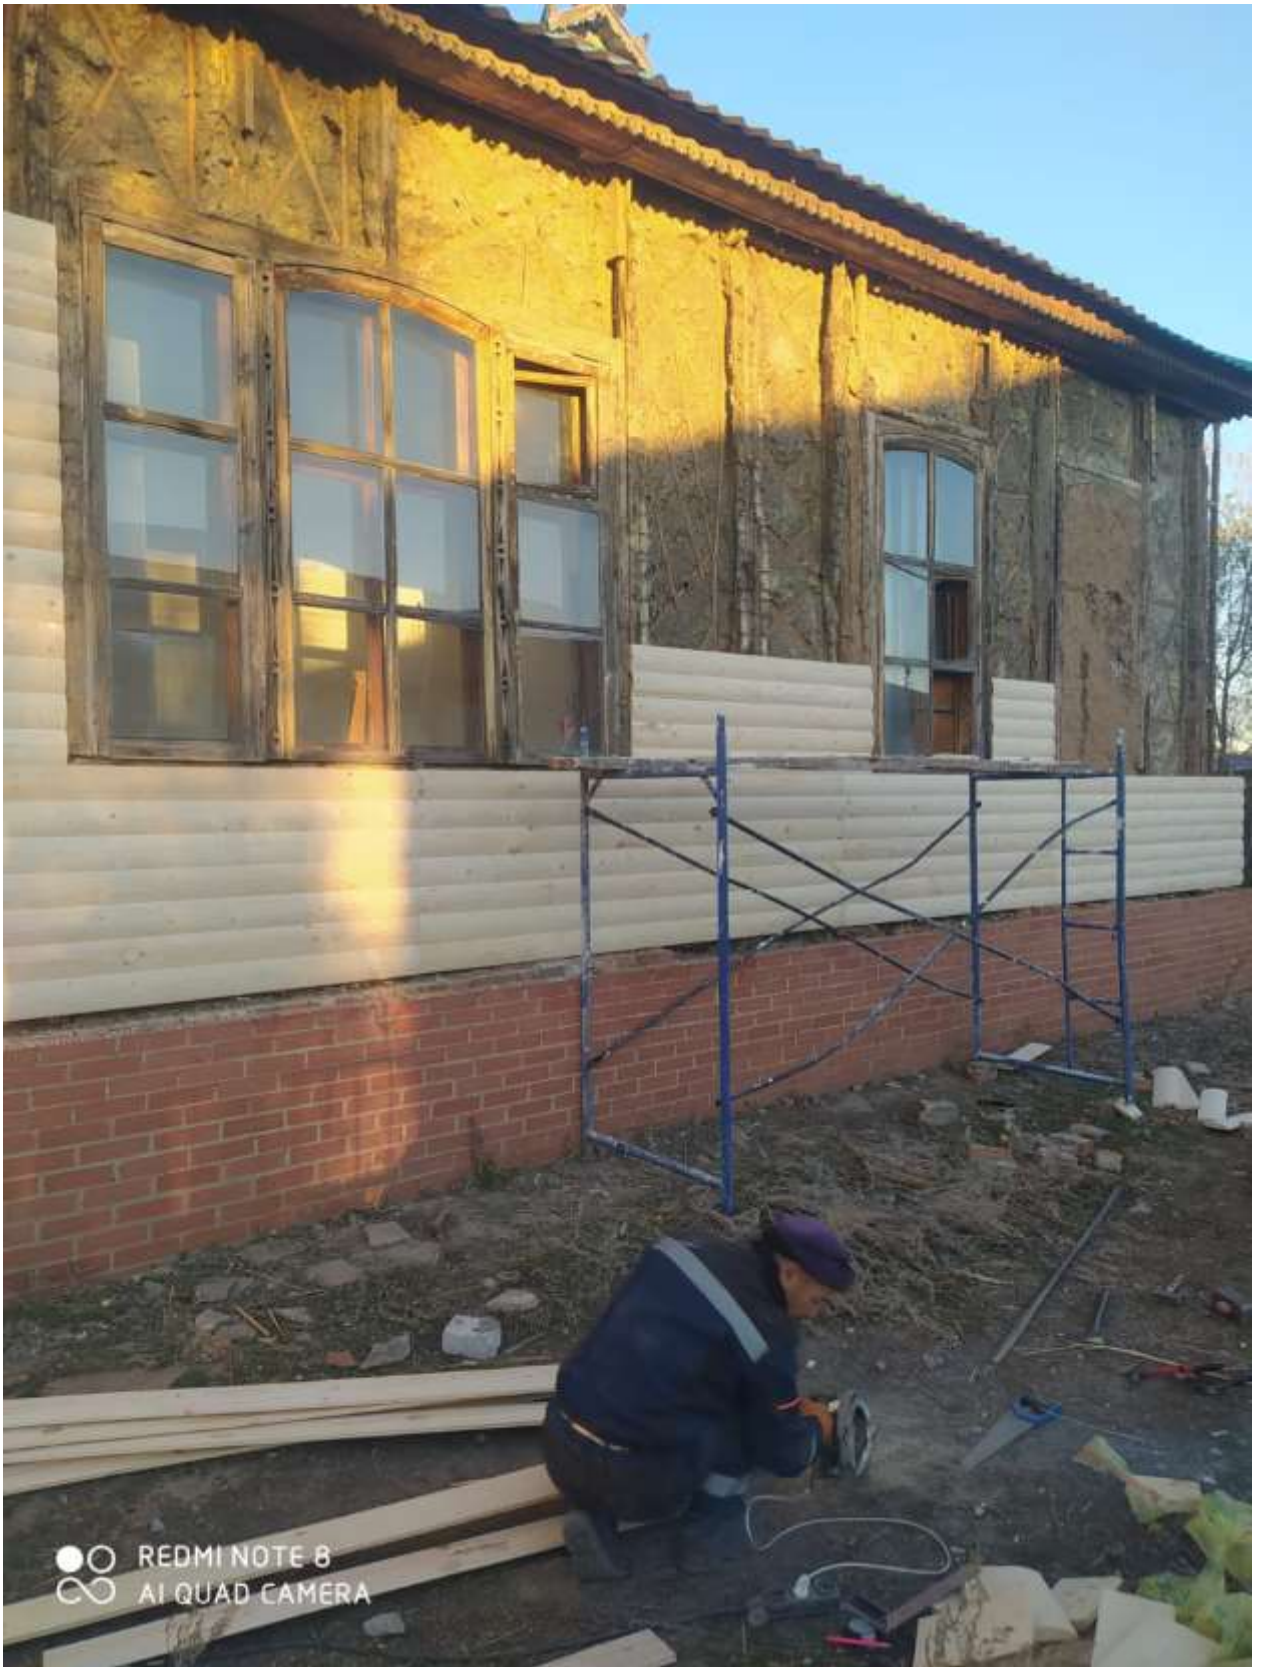









## Реставрационные работы интерьера




REDMI NOTE 8  
AI QUAD CAMERA








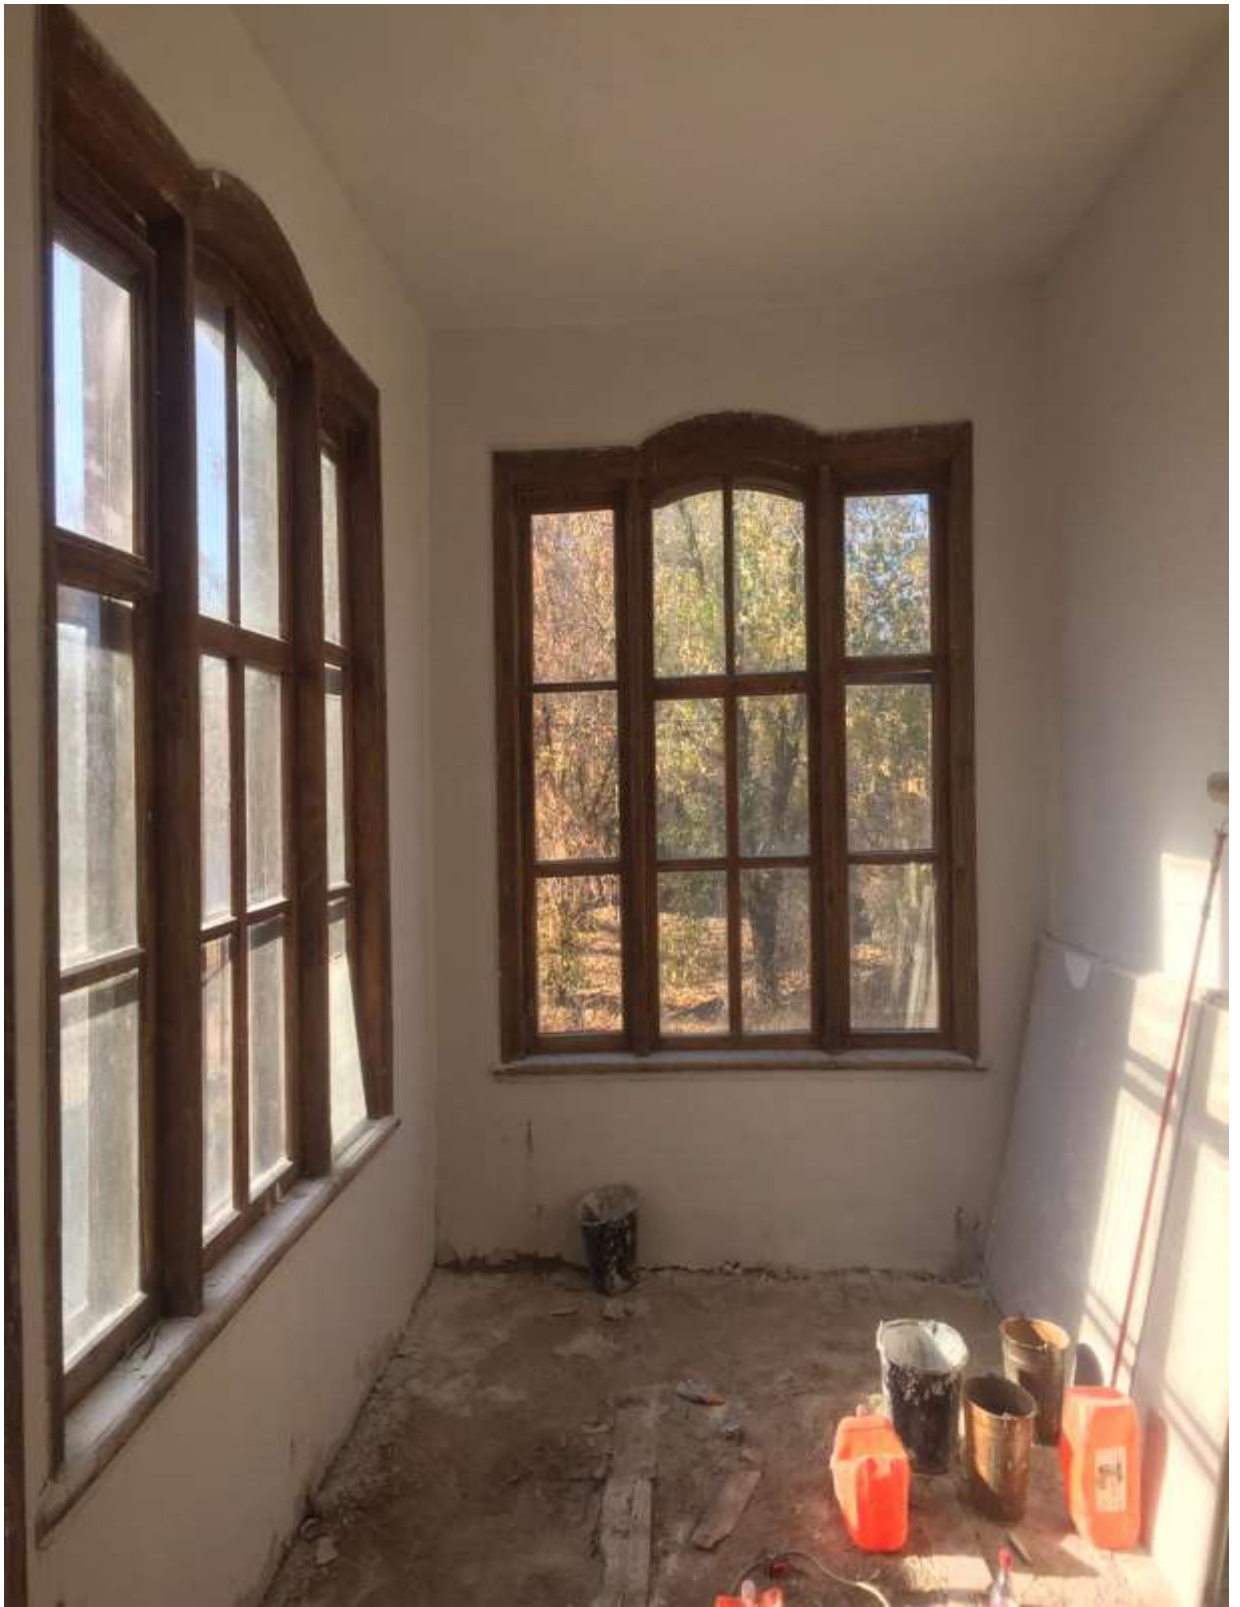



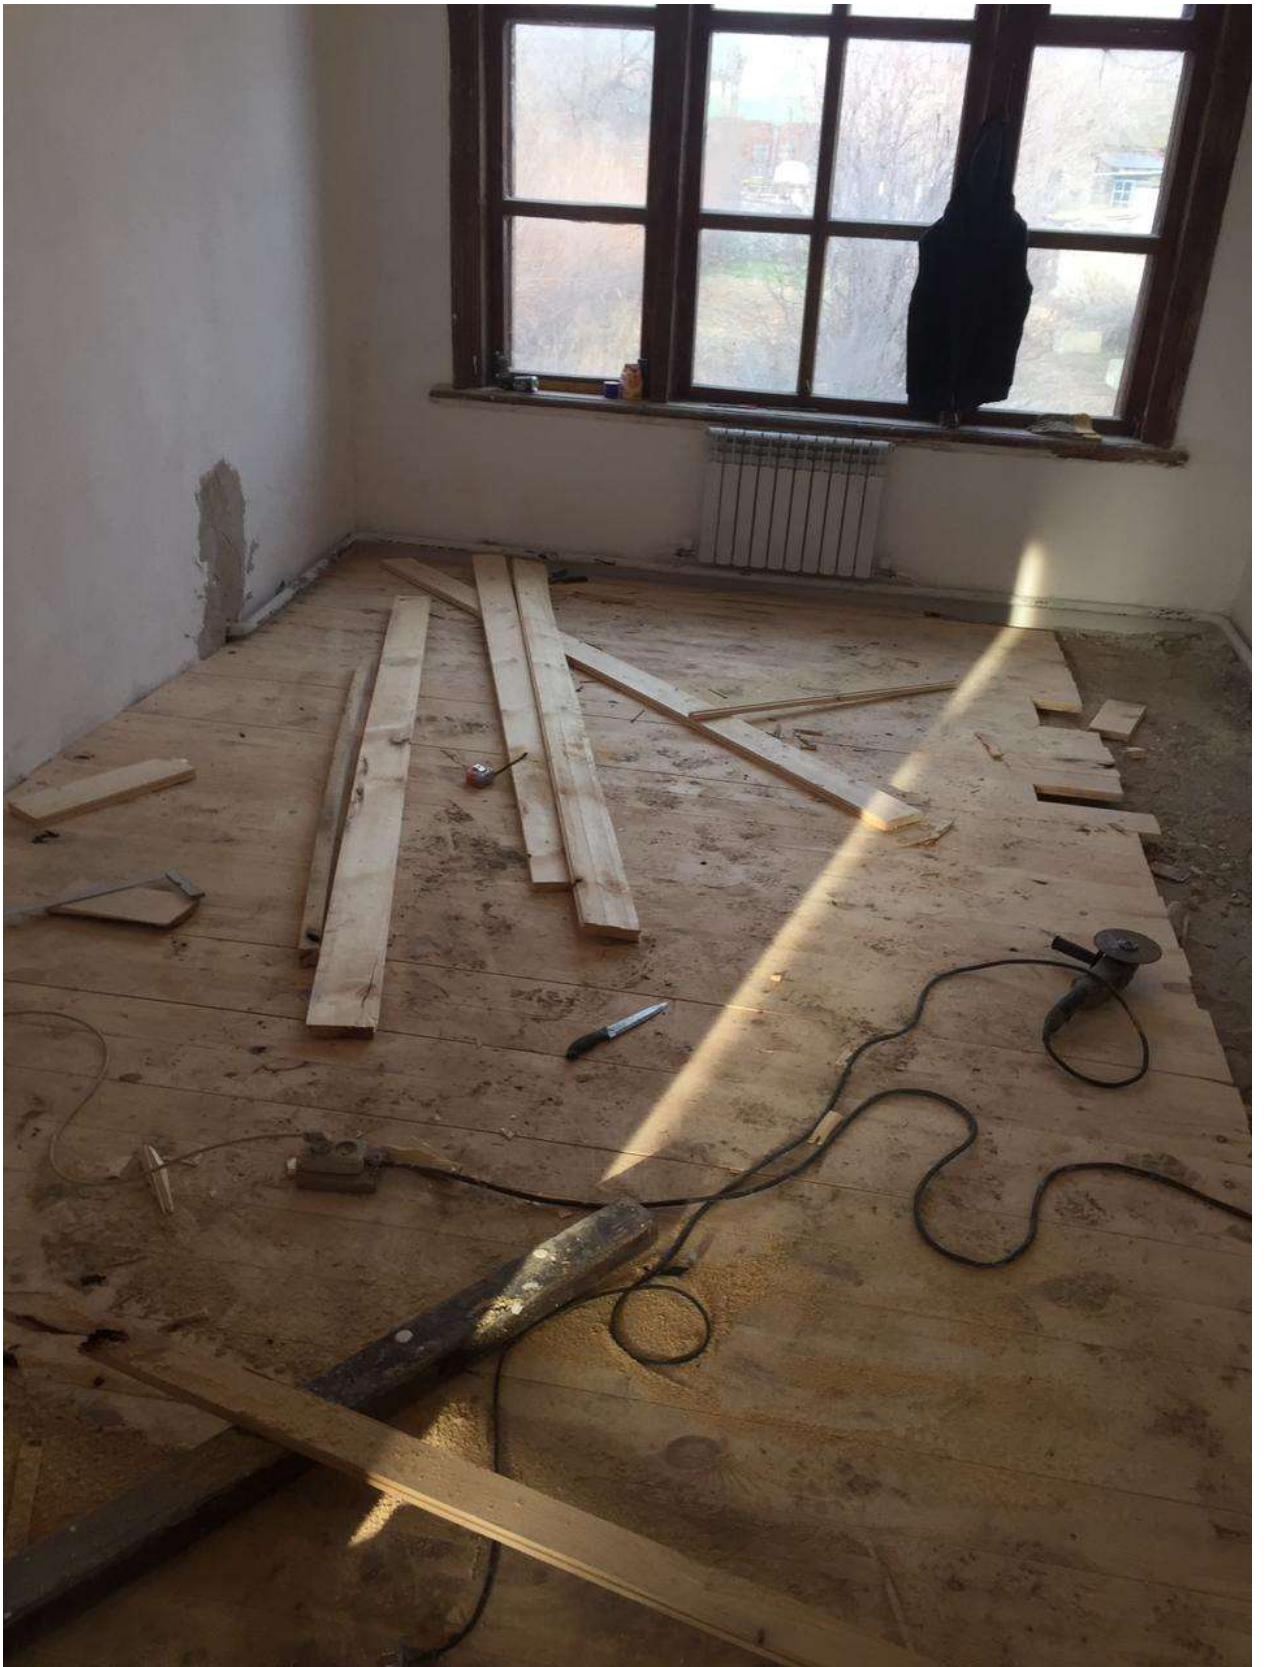





## Монтаж системы отопления





**Облицовка цоколя.**  
Расшивка швов цоколя



## Устройство крыльца и козырька



**Подземная мечеть Бекет ата в местности Огланды, XVIII века  
(научно-реставрационные работы, Мангистауская область)**

*Основные требования к научно-реставрационным работам по договору № 60 на выполнение государственного задания от «23» апреля 2021 г.*

- выравнивание полов всех помещений внутри мечети с обеспечением условия сохранения первичного облика;
- замена входной двери подземной мечети;
- реставрационные работы стен мечети;
- укрепительные работы основания склона;
- покрытие защитным раствором;
- приспособление территорий родника.

**Сметная стоимость научно-реставрационных работ 24 065 000 тенге.**

*Сумма выполненного объема с начало года: 0 тенге. (0 %)*

*На текущий период: 24 065 000 тенге (100 %)*

*Остаток: 0 тенге (0 %)*

**Проектом предусмотрено:**

Укрепление склона

Выравнивание полов в помещениях

Замена наружной двери

Прочистка и продувка дымохода, выполняющей функцию естественной вентиляции

Инектирование трещин

Замена покрытия площадки

Замена части ограждения площадки

Ремонт мергелевой штукатурки

Устройство водоотводного лотка

Родник №1

Демонтаж ступеней, колодца, покрытия пола беседки

Устройство ступеней, колодца

Устройство пола беседки

Устройство водосборных лотков с подпорной стенкой

Устройство декоративного родника из камн

**В акте приемки выполненных работ №1 за октябрь-ноябрь 2021 года (на текущий период) включены нижеследующие виды и объемы научно-реставрационных работ:**

- Воссоздание оконных и дверных коробок с прямолинейным верхом из целого элемента
- Демонтаж, монтаж покрытия площадки из плит ракушечника-
- Заполнение швов известково- песчаным раствором
- Ремонт меловой штукатурки спецраствором №1, толщ. до 3см
- Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит

Предлагаем фотографий выполненных научно-реставрационных работ на объекте:

## Укрепительные работы основания склона













Подпорная стена






## Замена входной двери подземной мечети



## Покрытие защитным раствором





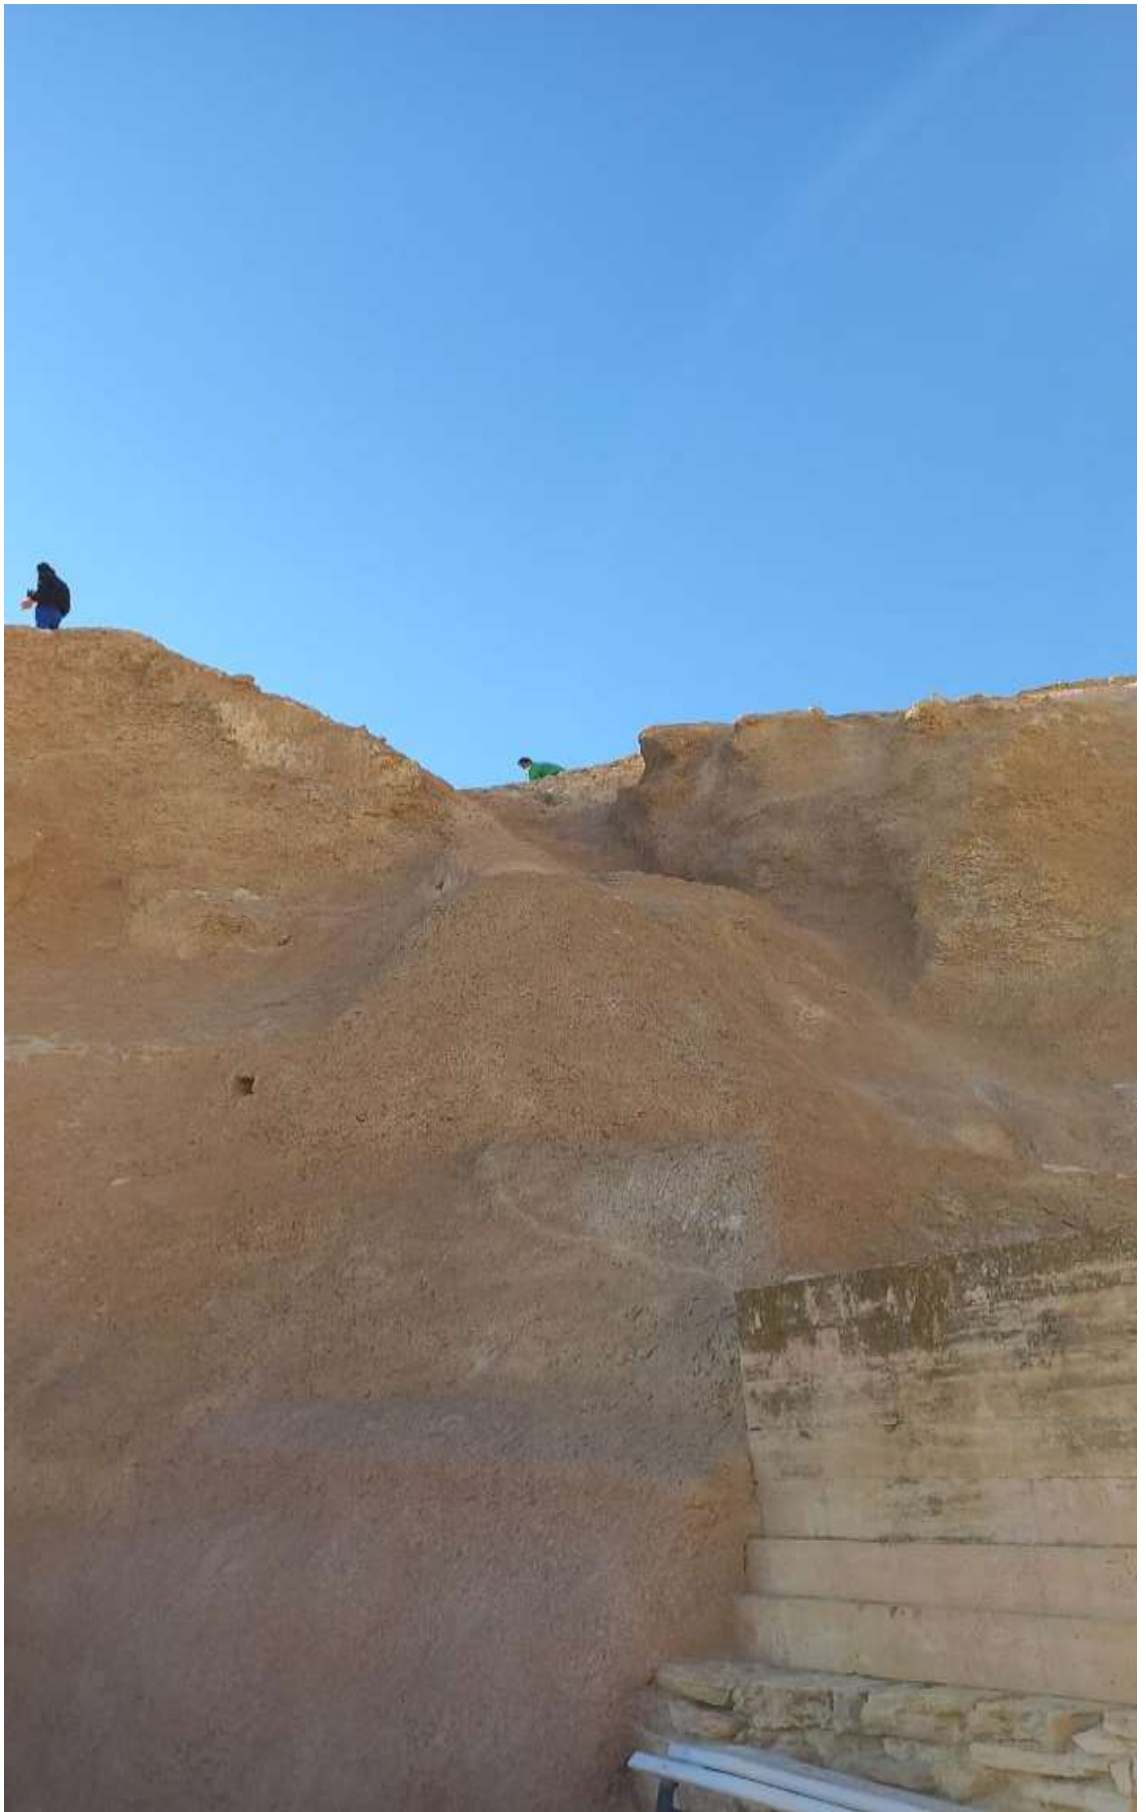










## Реставрационные работы стен мечети



## Ремонт дорожки

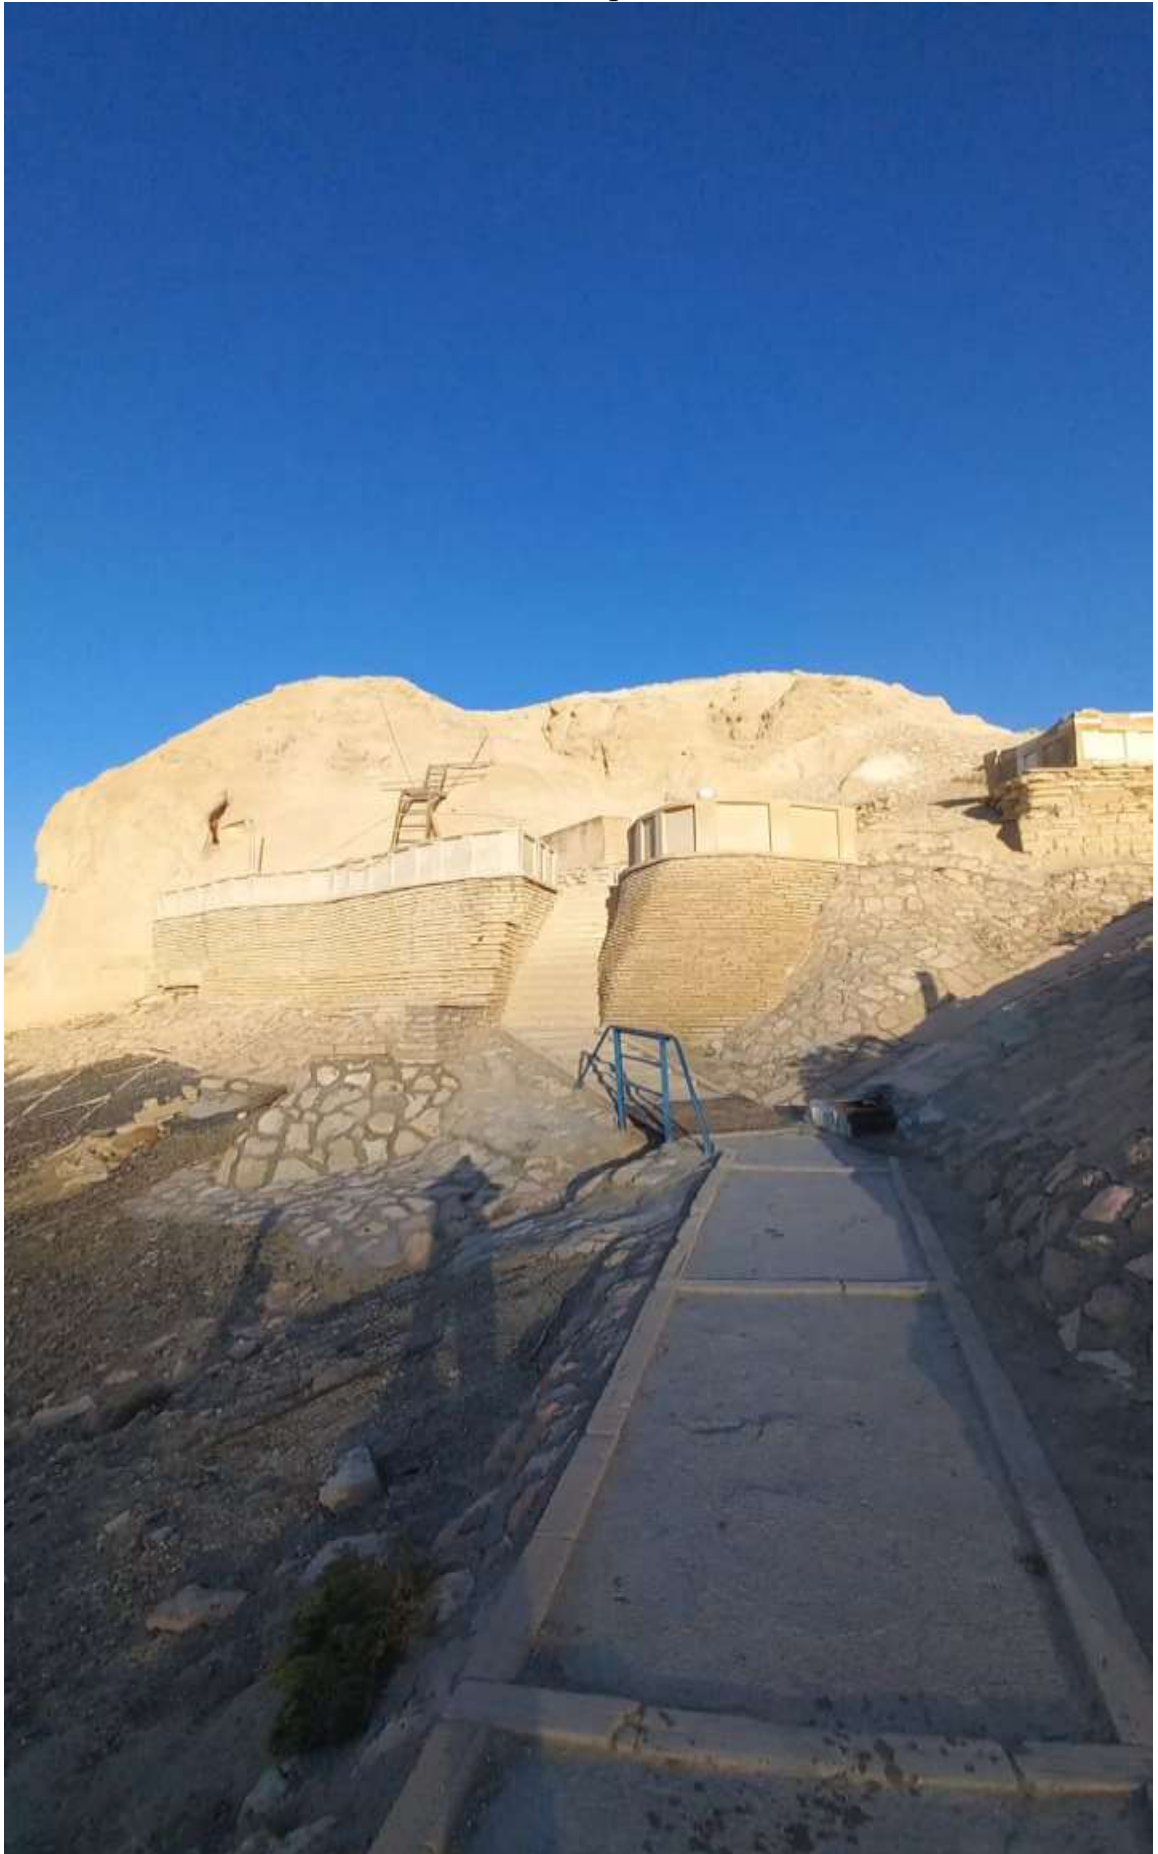

## Устройство ступеней





## Установка бордюров



# Выравнивание всех полов внутри







## Устройство ступеней





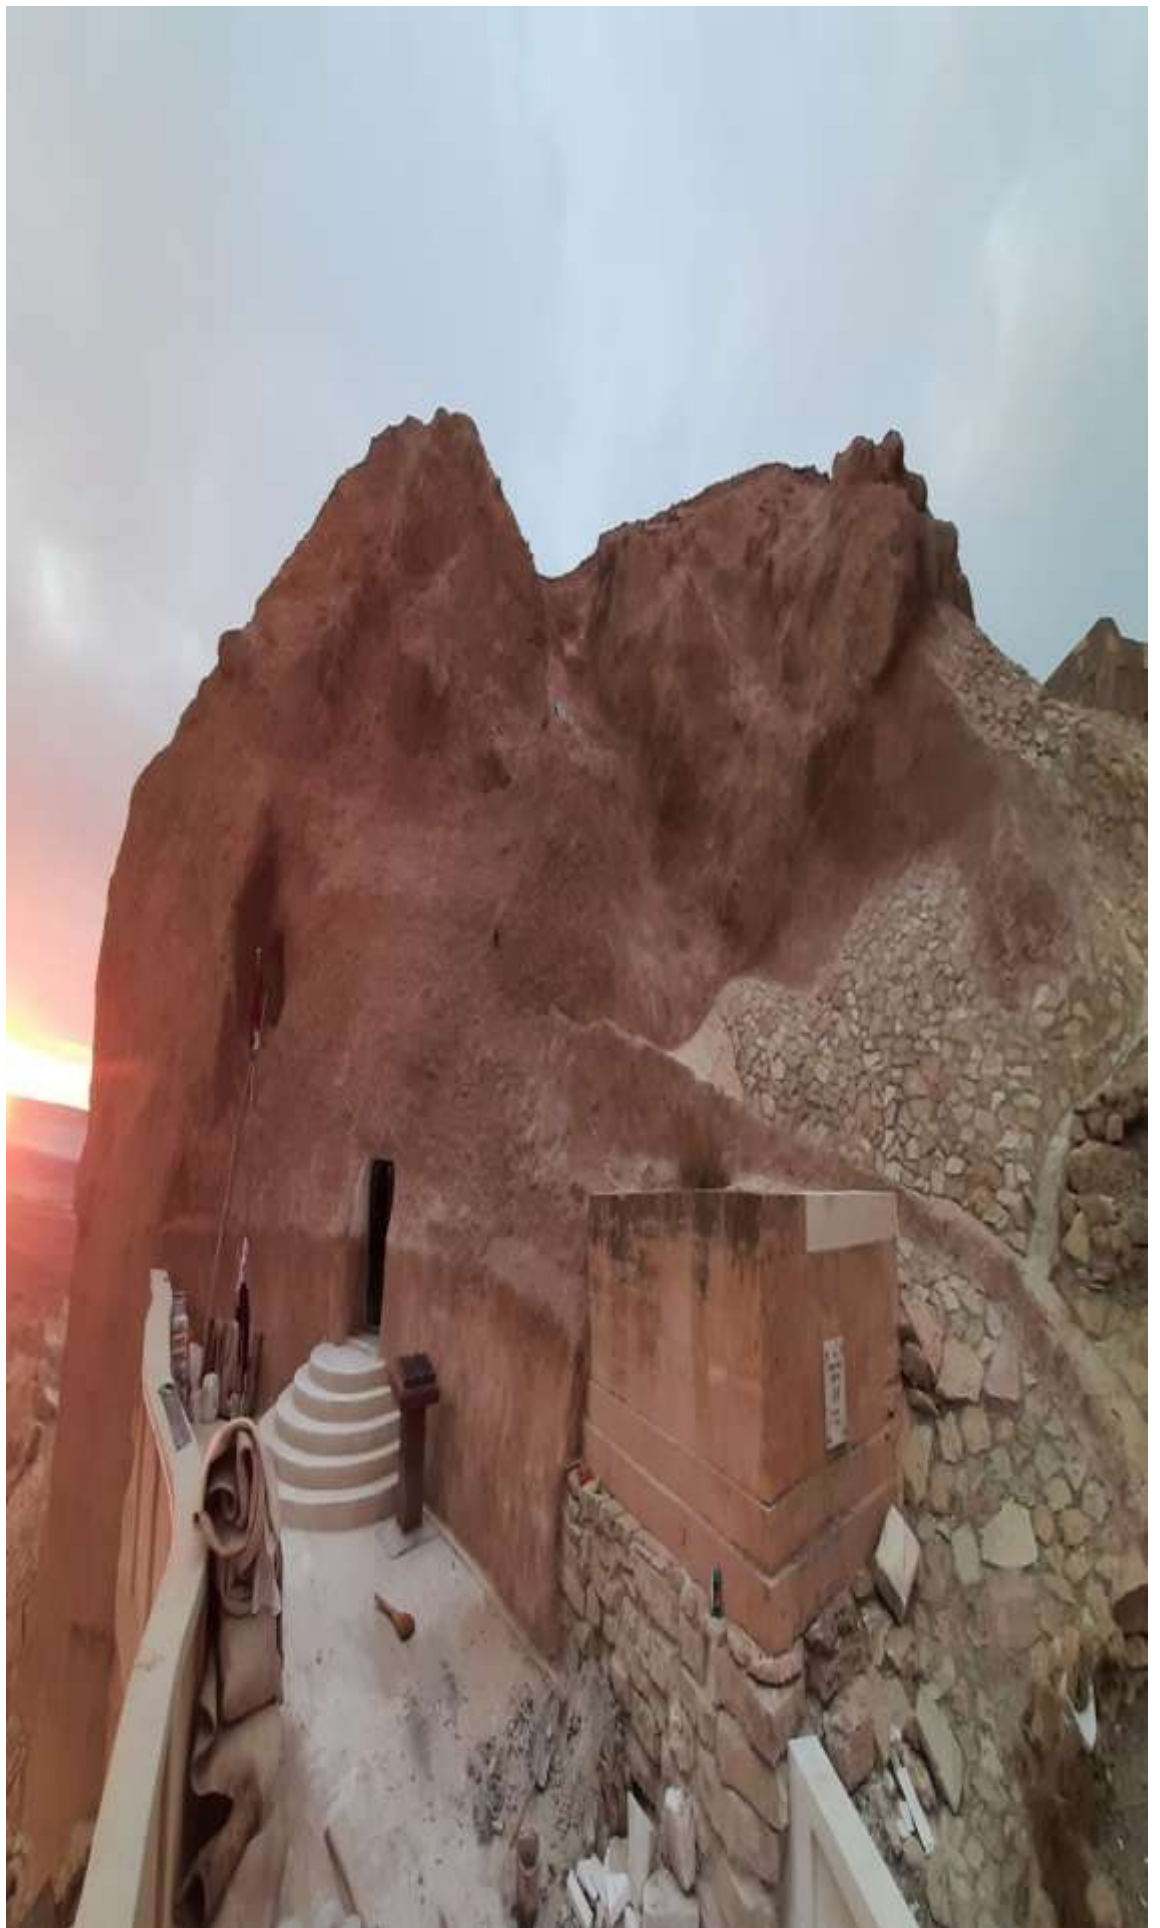

Плато

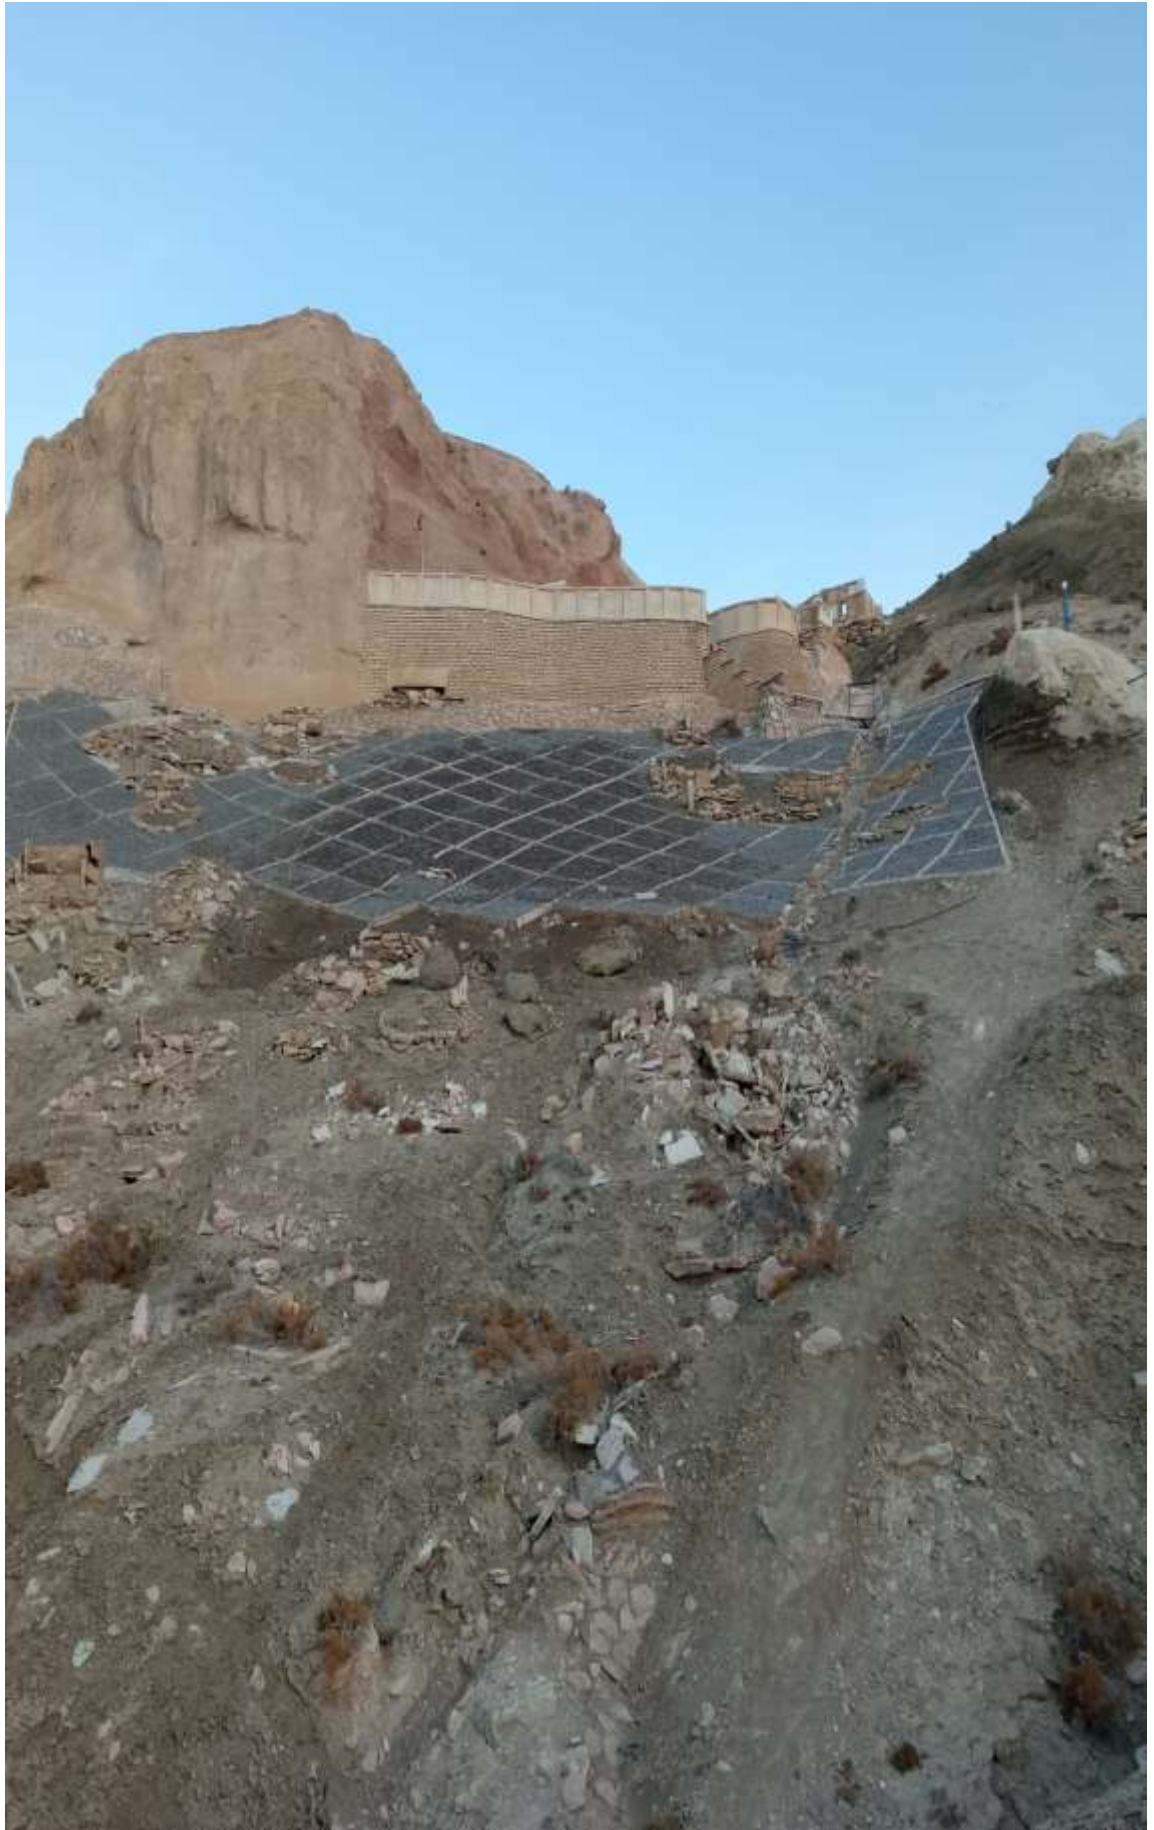



Центральный вход





Ремонт входной дорожки









## Приспособление территории родника

















