







Городище Сыганак (Сунаката), X-XVIII века (научно-реставрационные работы. Кызылординская область)

Основные требования к научно-реставрационным работам по договору № 60 на выполнение государственного задания от «23» апреля 2021 г.

- научно-изыскательские работы по определению следов входной группы;
- возведение входной группы по определенным следам.

Сметная стоимость научно-реставрационных работ 15 230 000 тенге.

Сумма выполненного объема с начало года: 0 тенге. (0 %)

На текущий период: 6 698 917 тенге (43,98 %)

Остаток: 8 531 083 тенге (56,02%)

В акте приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2021 года (на текущий период) включены нижеследующие виды и объемы научно- реставрационных работ:

- Ручная разборка кирпичей входного ворот
- Копания ям под наблюдениям археологов
- Закуп материалов

Научно-изыскательские работы по определению следов входной группы.







Возведение входной группы по определенным следам



















Мавзолей Маката, 1923 год (научно-реставрационные работы, Карагандинская область)

Основные требования к научно-реставрационным работам по договору № 60 на выполнение государственного задания от «23» апреля 2021 г.

- реставрационные работы мавзолея;
- восстановление и восполнение кладки кирпичей в местах разрушений и утраченных частях;
- устройство гидроизоляции кровли из специального глиняного раствора;
- зачеканка швов кладки специальным глиняным раствором;
- устройство отмостки из специального глиняного раствора;
- устройство ограждения и мощения природного камня.

Сметная стоимость научно-реставрационных работ 14 195 000 тенге.

Сумма выполненного объема с начало года: 14 195 000 тенге. (100 %)

На текущий период: 0 тенге (0 %)

Остаток: 0 тенге (0 %)

Научно-реставрационные работы.

Восстановление и восполнение кладки кирпичей в местах разрушений и утраченных частях цоколя, трехчетвертных колонн по углам, карнизах цоколя, кровли; парапета.

В акте приемки выполненных работ №2 за июль-август 2021 года (на текущий период) включены нижеследующие виды и объемы выполненных научно-реставрационных работ:

- восстановление и восполнение кладки кирпичей в местах разрушений и утраченных частях цоколя, трехчетвертных колонн по углам, карнизах цоколя, кровли; парапета. – **22 м2.**
- устройство гидроизоляции кровли из специального глиняного раствора – **21м2.**
- зачеканка швов кладки специальным глиняным раствором – **6 292 м.**
- устройство отмостки из каменного плитняка – **62,4 м2.**
- благоустройство территории, устройство ограждения и мощения – **59,32 м.**

Восстановление и восполнение кладки кирпичей в местах разрушений и утраченных частях цоколя, трехчетвертных колонн по углам, карнизах цоколя, кровли; парапета.









Устройство гидроизоляции кровли из специального глиняного раствора;





Зачеканка швов кладки специальным глиняным раствором;





Реставрационные работы мавзолея







Устройство отмостки из специального глиняного раствора









Мавзолей Лабака, XIX век (научно-реставрационные работы, Карагандинская область)

Основные требования к научно-реставрационным работам по договору № 60 на выполнение государственного задания от «23» апреля 2021 г.

- реставрационные работы мавзолея;
- устройство отмостки;
- установка металлической решетчатой двери в проеме входа;
- устройство нового металлического ограждения в утраченных местах.

Мавзолей Лабака характеризует архитектуру мемориально-культовых сооружений Центрального Казахстана конца XIX века, являясь одним из лучших мавзолеев этого периода в регионе Сарыарки. История создания, год строительства, имя мастера-строителя, соорудившего этот памятник, неизвестны и в устных и письменных источниках не сохранились.

Сметная стоимость научно-реставрационных работ 15 185 000 тенге.

Сумма выполненного объема с начало года: 15 185 000 тенге. (100 %)

На текущий период: 0 тенге (0 %)

Остаток: 0 тенге (0 %)

В акте приемки выполненных работ №2 за июль-август 2021 года (на текущий период) включены нижеследующие виды и объемы выполненных научно-реставрационных работ:

- восстановление и восполнение разрушенных кирпичей кладки на карнизах кровли и парапете портала – **41,1 м2.**
- инъектирование глиняно-песчаным раствором промоин на кровле - **30 м.**
- зачеканка швов кладки купола специальным глиняным раствором – **361 м.**
- отмостки из камель-плитняка – 187,24 м2
- очистка пола внутреннего помещения мавзолея от навоза и птичьего помета – **10 т.**
- ремонт пола в местах разрушения раствора глины между кирпичами – **27 м2.**
- устройство кирпичного порога в 2 ряда в порталной нише **1,6 м2.**
- инъектирование трещин глиняно-песчаным раствором на северо-западном фасаде и на стенах внутри помещения – **30м.**
- вычинка разрушенных кирпичей – **14,4 м2.**
- зачеканка швов кладки стен фасадов, внутренних стен помещения, подпольного пространства – **5830 м.**
- окраска орнаментированных кирпичей по всем фасадам – **1,2 м2.**
- Монтаж ограждения – **0,76 т.**


Реставрационные работы мавзолея.

Восстановление и восполнение разрушенных кирпичей кладки на карнизах кровли и парапете портала





Ремонт пола в местах разрушения раствора глины между кирпичами

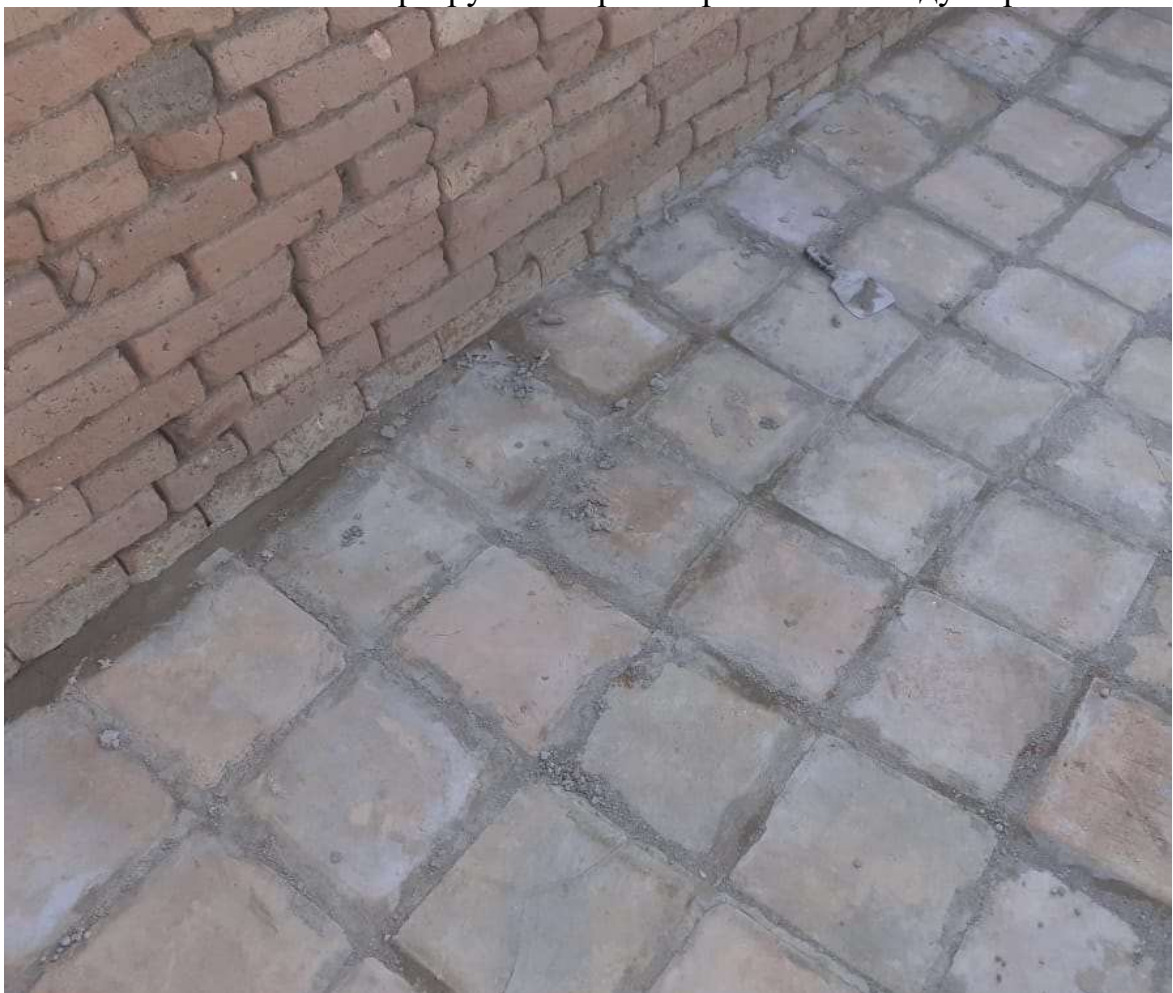

Вычинка разрушенных кирпичей





Зачеканка швов кладки стен фасадов, внутренних стен помещения, подпольного пространства








Устройство нового металлического ограждения в утраченных местах







Установка металлической решетчатой двери в проеме входа.

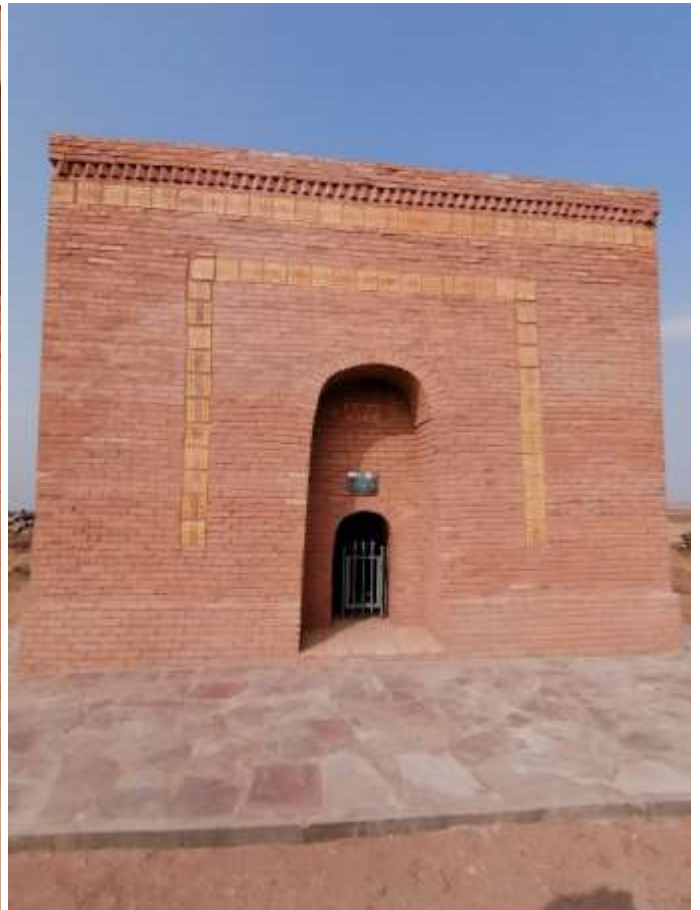



**Комплекс архитектурно-художественного музея «Жаркентская мечеть»
(мечеть, медресе, ворота главные, ворота боковые (южные, северные), XIX век
(научно-реставрационные работы, Алматинская область)**

Основные требования к научно-реставрационным работам по договору № 60 на выполнение государственного задания от «23» апреля 2021 г.

- В мечети отреставрировать деревянные колонны;
- Реставрационные работы внутри здания;
- Расчистка росписей на деревянных изделиях от пыли и помета;
- Окраска полов антресолей, башни на двух ярусах;
- Расчистка и окраска, кровли головной мечети, с предварительной шпатлевкой щелей и грунтовкой поверхности.

Сметная стоимость научно-реставрационных работ 29 295 000 тенге.

Сумма выполненного объема с начало года: 29 295 000 тенге (100%)

На текущий период: 0 тенге (0%)

Остаток: 0 тенге (0%)

В акте приемки выполненных работ №1 и №2 за 2021 года (на текущий период) включены нижеследующие виды и объемы научно- реставрационных работ:

- Окраска стен фасада, расшивка трещин в штукатурке – 250 м²
- Отбивка штукатурки колонн – 142 м²
- Окраска стен водоэмульсией стен помещения мечети – 530 м²
- Очистка, ремонт мечети – 1800 м²
- Покраска кровли мечети – 250 м²
- Штукатурка колонн в два слоя – 142 м²
- Колонны. Покраска – 142 м²
- Реставрационные работы башен на двух ярусах
- Окраска масляными составами за два раза кровельного покрытия– 1800 м²
- Художественно-реставрационные работы (башни на двух ярусах, помещение с минбаром)

Окраска стен фасада, расшивка трещин в штукатурке







Реставрация деревянных колонн





Реставрационные работы внутри здания
Окраска стен водоэмульсией стен помещения мечети





Расчистка и окраска, кровли головной мечети, с предварительной шпатлевкой щелей и грунтовкой поверхности









Штукатурка колонн в два слоя



Покраска колонн в два слоя





**Реставрационные работы башен на двух ярусах. Расчистка росписей на
деревянных изделиях от пыли и помета.
До реставрации**



Окраска полов антресолей, башни на двух ярусах



Окраска масляными составами за два раза кровельного покрытия





Художественно-реставрационные работы
До реставрации





После реставрации






После завершения реставрационных работ







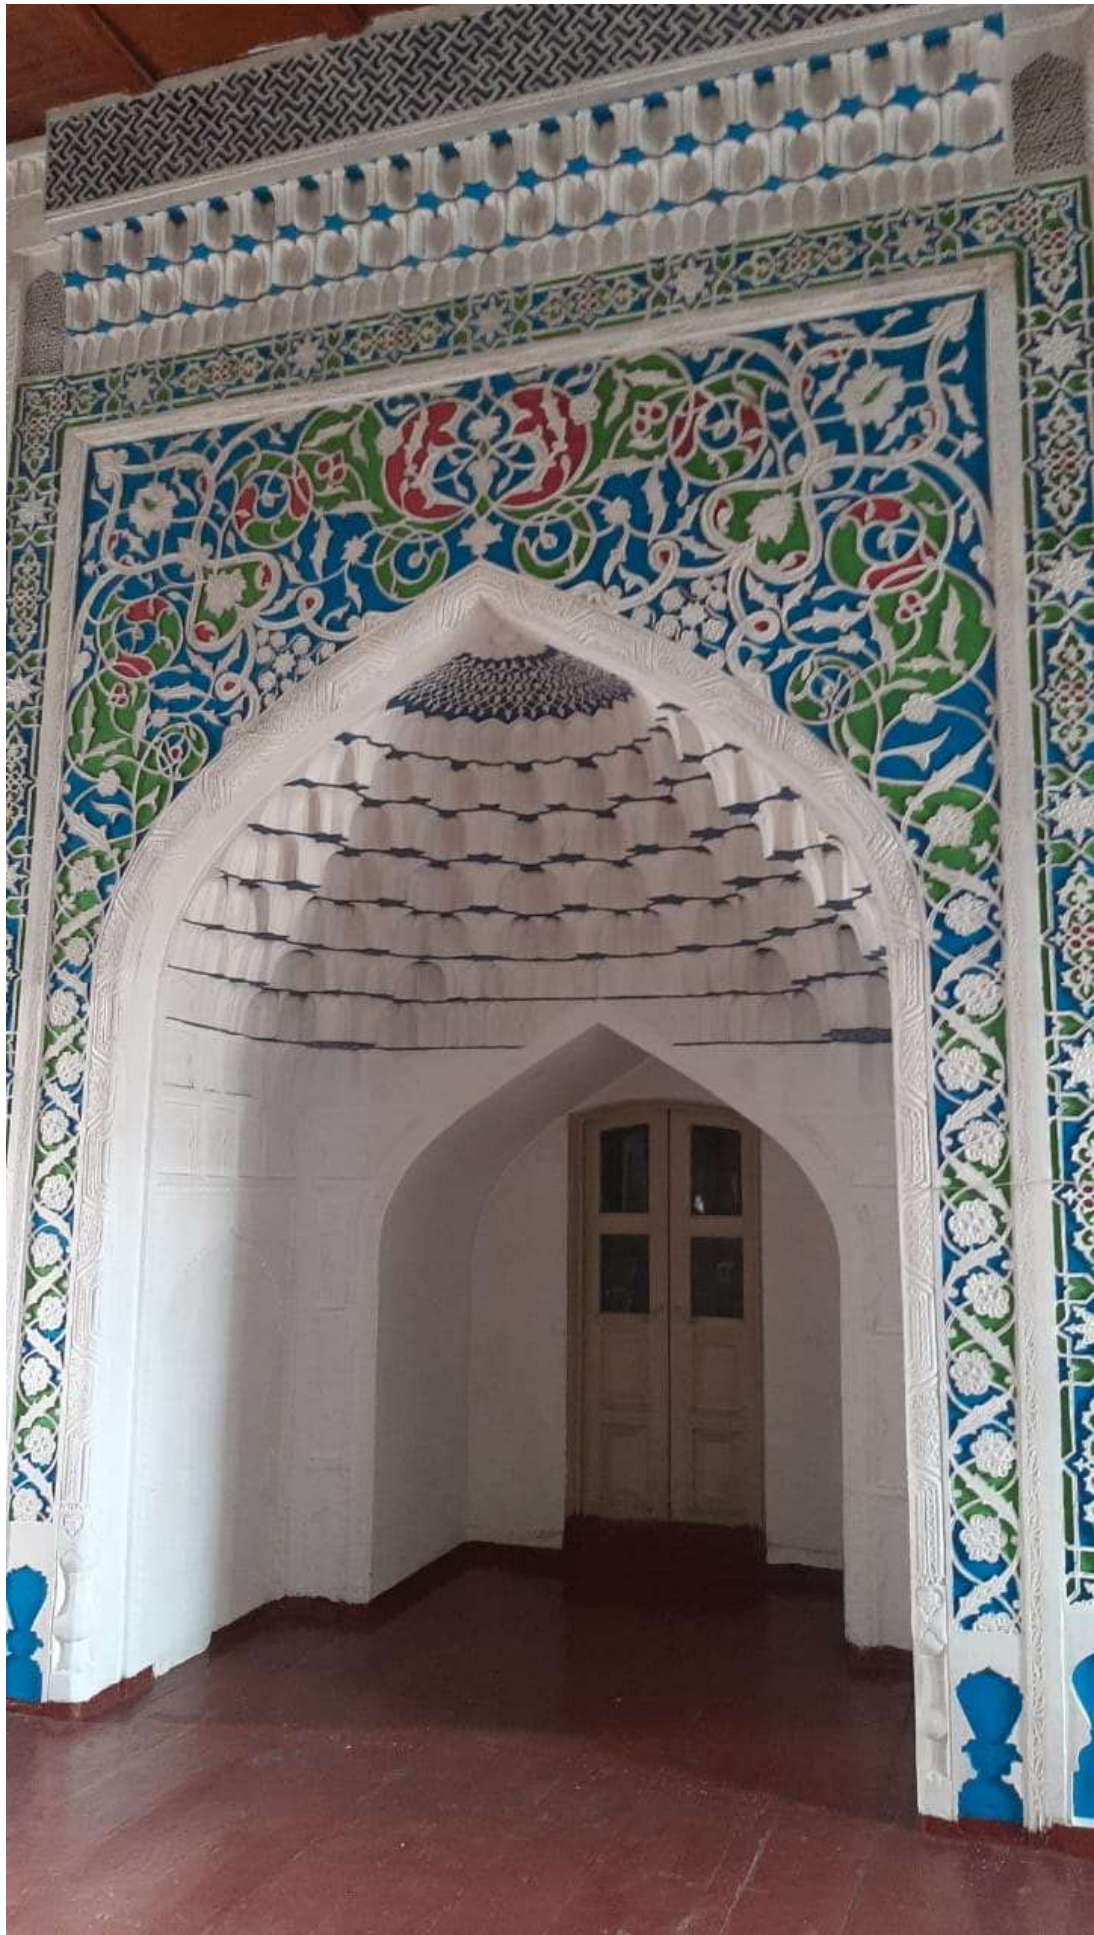







**Городское начальное реальное училище имени А. Колпаковского,
ныне - здание республиканского государственного предприятия
«Казреставрация», 1 890 год (научно-реставрационные работы, город
Алматы)**

*Основные требования к научно-реставрационным работам по договору № 60 на
выполнение государственного задания от «23» апреля 2021 г.*

- электромонтажные работы;
- ремонт отопительных систем;
- реставрационные работы интерьера.

Сметная стоимость научно-реставрационных работ 19 430 000 тенге.

Сумма выполненного объема с начало года: 5 262 102 тенге (27%)

На текущий период: 14 167 898 тенге (73 %)



Остаток: 0 тенге (0 %)

В акте приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2021 года (на текущий период) включены нижеследующие виды и объемы научно- реставрационных работ:

- материалы для электромонтажных и отопительных работ
- электромонтажные работы
- отопительные системы
- оштукатуривание стен сухими смесями – 750 м2
- окраска вододисперсионными составами – 640 м2
- Потолки. Оштукатуривание и покраска - 350 м2



Электромонтажные работы

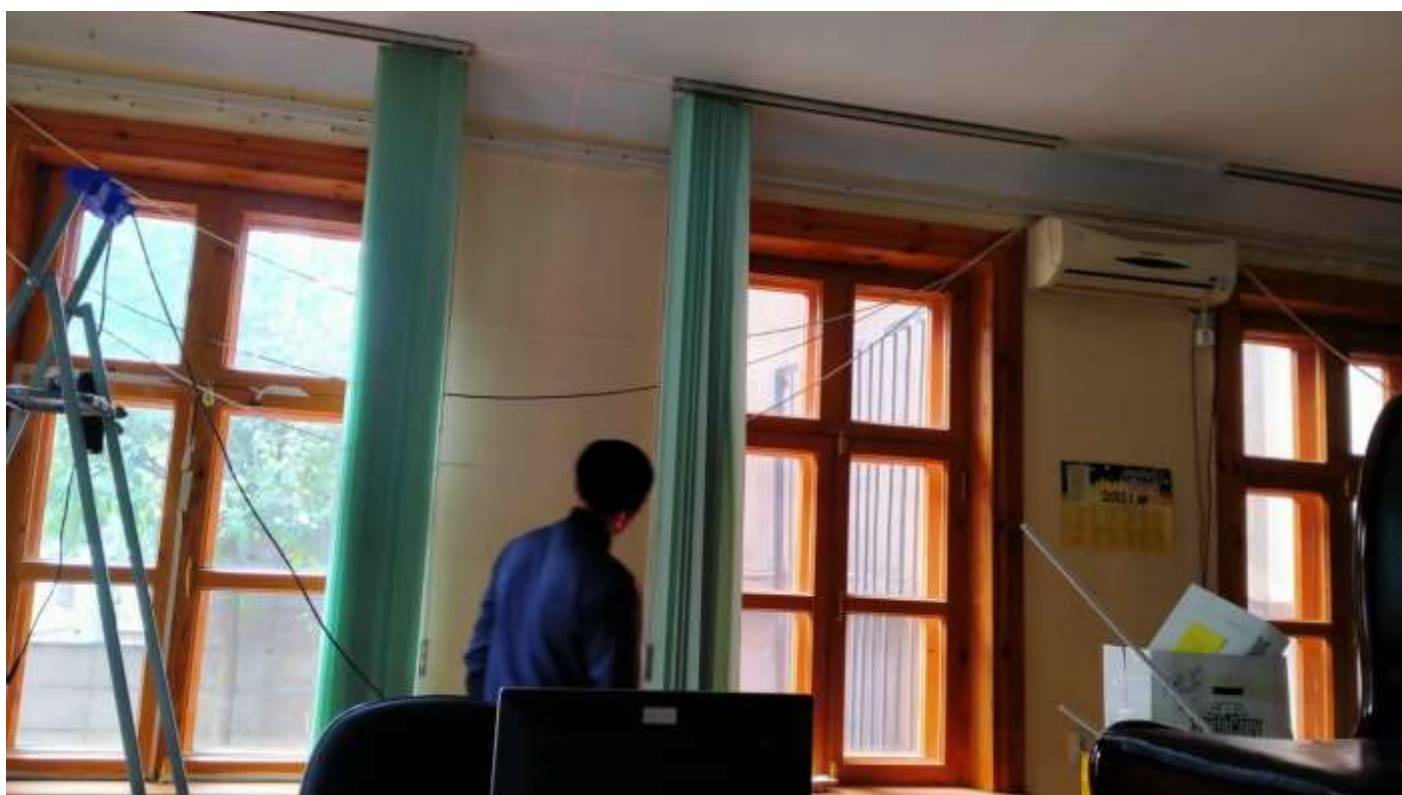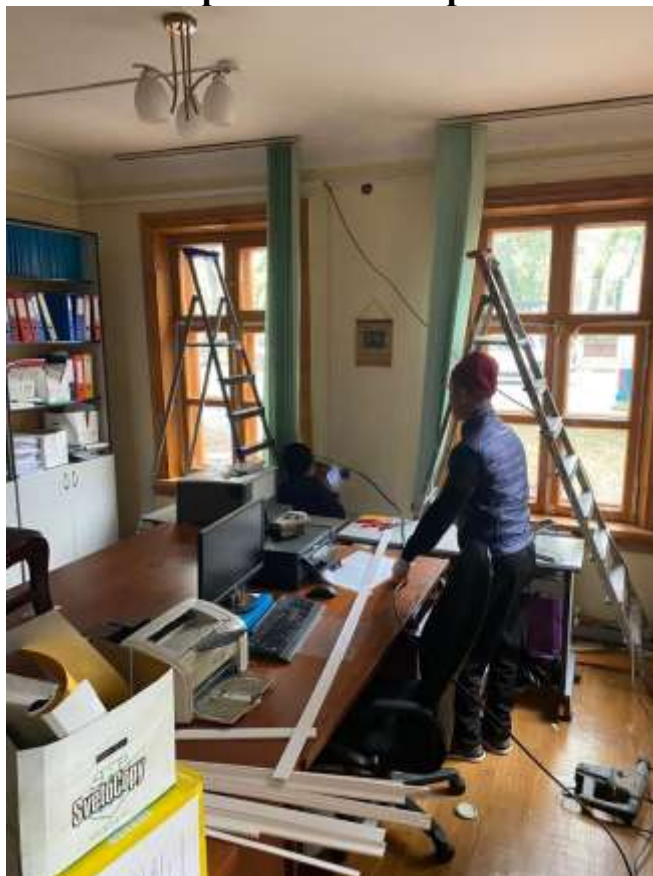









Ремонт отопительных систем







Реставрационные работы интерьера

























Завершенные фотографии













Мечеть Айтбая, Мастера Искан и Камал, 1878 год (научно-реставрационные работы, Кызылординская область)

Основные требования к научно-реставрационным работам по договору № 12 на выполнение государственного задания от «27» апреля 2021 г.

- устройство отмостки;
- устройство цоколя, стилобат;
- реставрационные работы фасада и айвана;
- устройство кровли;
- реставрационные работы интерьера;
- ремонтные работы оконного проема и заполнение дверного проема;
- реставрационные работы минарета.

Сметная стоимость научно-реставрационных работ 19 430 000 тенге.

Сумма выполненного объема с начало года: 19 430 000 тенге. (0 %)

На текущий период: 0 тенге (0 %)

Остаток: 0 тенге (0%)

В акте приемки выполненных работ №1 за июль-август 2021 года (на текущий период) включены нижеследующие виды и объемы выполненных научно-реставрационных работ:


- устройство кровли – **126,9 м2.**
- реставрационные работы фасада и айвана – **366 м2.**
- реставрационные работы интерьера – **113,72 м2**
- ремонтные работы оконного проема и заполнения дверного проема – **20 створок.**
- устройство отмостки – **112м2.**
- Замазка шпаклевкой трещин колонн и покраска лаком-**84м2**

Устройство кровли





Реставрационные работы минарета

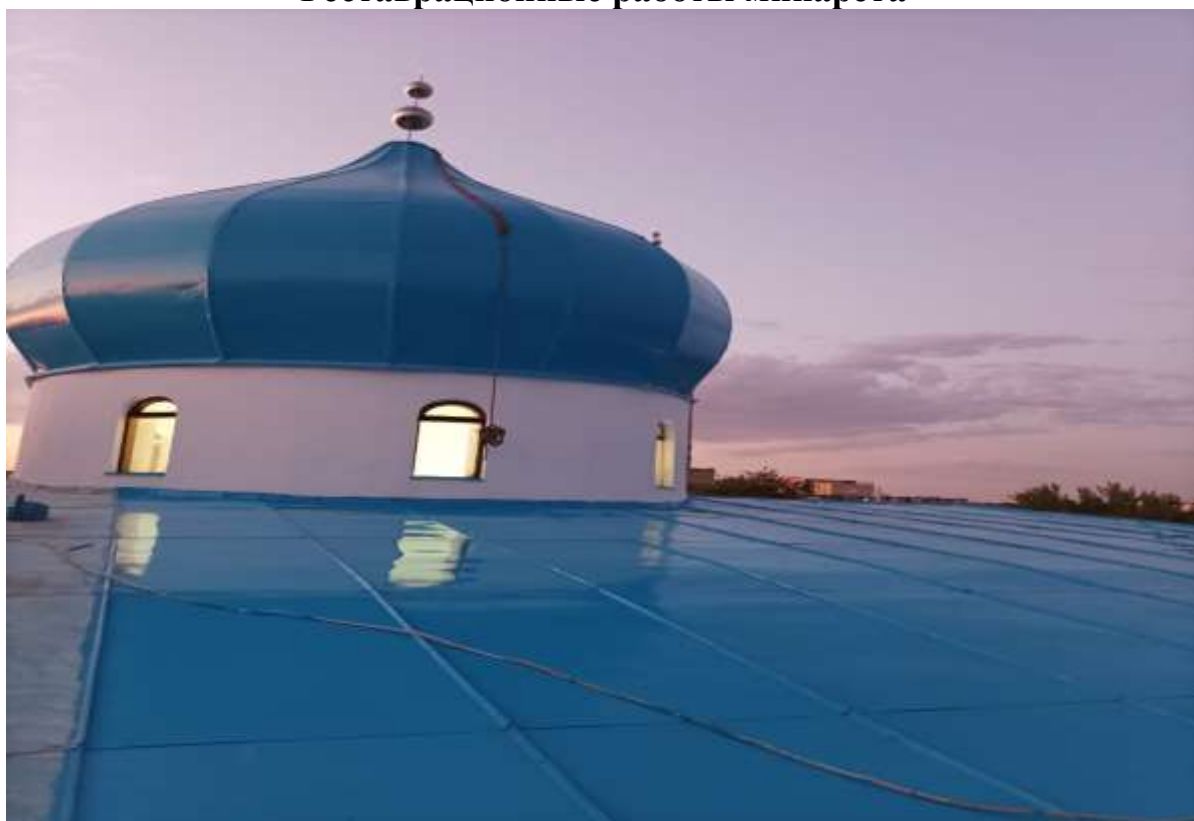





Устройство отмостки






Ремонтные работы оконного проема и заполнения дверного проема



Реставрационные работы интерьера




Реставрационные работы фасада и айвана

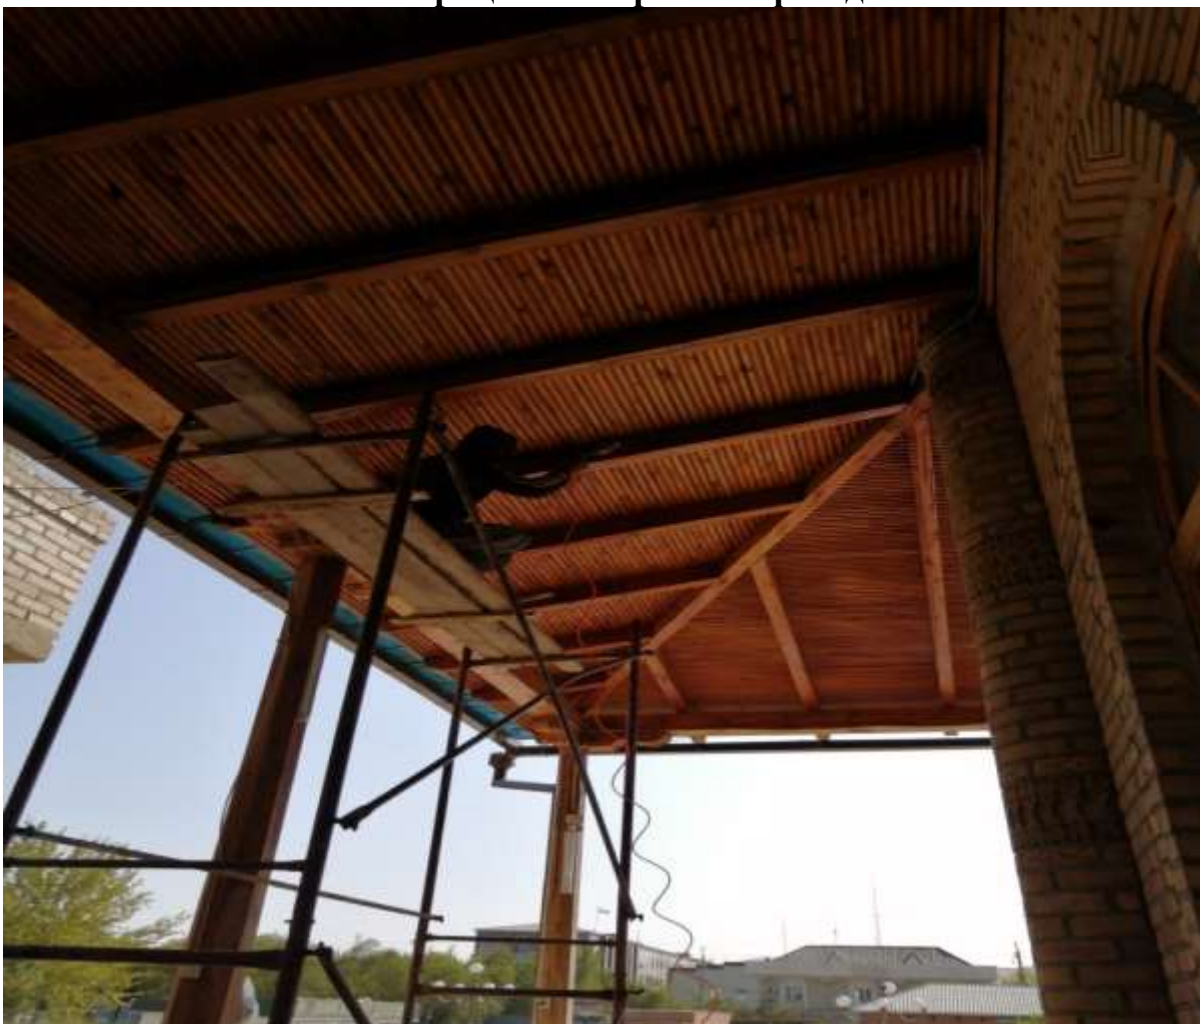



Устройство цоколя, стилобат

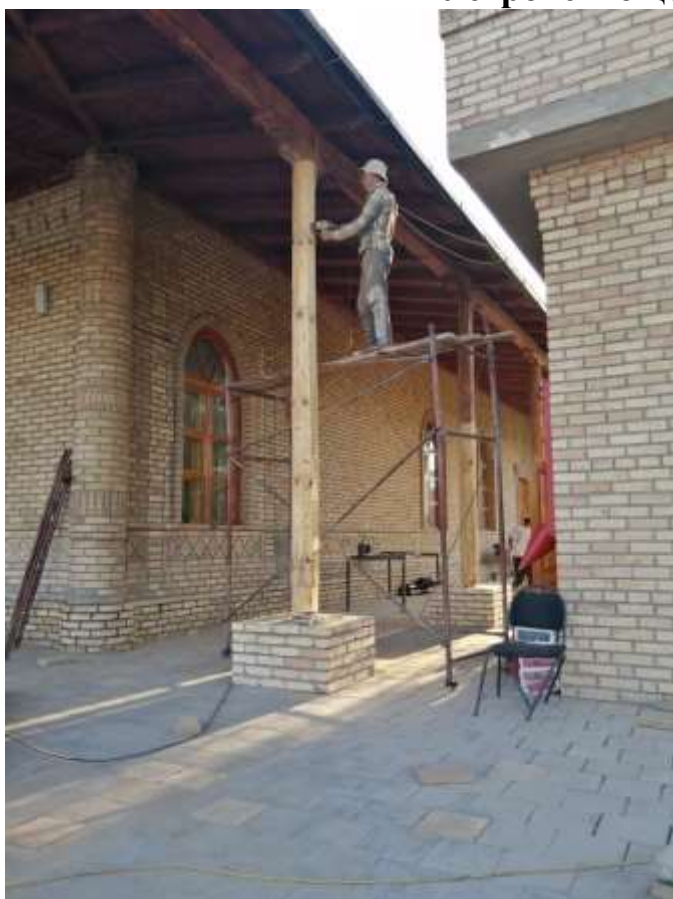

**Археолого-архитектурный комплекс «Усадьба Сырымбет (Усадьба Валихановых)
XIX век (научно реставрационные работы,
Северо-Казахстанская область)».**

Основные требования к научно-реставрационным работам по договору № 60 на выполнение государственного задания от «23» апреля 2021 г.

- реставрационные работы кровли;
- реставрационные работы фасадов;
- отделочные работы в интерьере;
- благоустройство территории.

Сметная стоимость научно-реставрационных работ 23 660 000 тенге.

Сумма выполненного объема с начало года: 23 660 000 тенге. (100%)

На текущий период: 23660000 тенге (100%)

Остаток: 0 тенге (0%)

В акте приемки выполненных работ №1 за май – июнь 2021 года (на текущий период) включены нижеследующие виды и объемы научно- реставрационных работ:

- Устройство инвентарных лесов по фасадам Н=5,8. Установка и разборка – 104,4 м²;
- Устройство подмостей в интерьерах Н=2,1 – 29 м²;
- Демонтаж верхнего слоя кровельного покрытия из теса (доски толщ.22мм) – 130м²;
- Частичный демонтаж деревянной обрешетки (деградированный деревянный брус 50х50мм) – 20м²;
- Устройство пароизоляции в 1 слой пергамина – 60м²;
- Устройство кровельного покрытия из однослойного теса (обрезные. строганные доски 22х200 мм) – 130 м²;
- Пропитка теса льняной олифой за 3 раза – 260 м²;
- Перекрытия с укладкой балок по рубленным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство (брус деревянный 0,2х0,2 длиной 2,5м – 3шт, брус деревянный 0,2х0,2 длиной 1,2 м-4 шт) – 18 м²;
- Обработка всех деревянных элементов перекрытий и кровли огнезащитными составами – 700 м²;
- Покрытия. Антисептирование – 700 м²;
- Расчистка фасада, шлифовка – 135 м²;
- Стены. Ремонт конопатки – 140 м шва;
- Заделка сквозных отверстий и швов деревянными протезами -210м стыка;
- Пропитка всех деревянных конструкций и деталей фасада льняной олифой за 3 раза – 135 м²;
- Зачистка и шлифовка досок потолков и балок перекрытия – 120 м²;
- Покрытие натуральной льняной олифой всех деревянных поверхностей за 3 раза – 120 м²;
- Поверхность потолков пролифленная. Покрытие масляными или спиротвыми лаками за 1 раз – 120 м²;
- Частичная расчистка оштукатуренной поверхности стен – 20м²;

- Левкас поверхности стен – 35 м²;
- Окраска стен (высококачественная) поливинилацетатными водоэмульсионными красками с добавлением пигментов – 135 м²;
- Замена оконных рам (размеры-1,0х1,5м)-Переплеты оконные остекленные. Снятие – 24 м²;
- Грунтовка деревянных оконных блоков натуральной льняной олифой за 3 раза – 12 м²;
- Устройство инвентарных лесов по фасадам Н = 6,8. Установка и разборка 149,6 м²;
- Демонтаж верхнего слоя кровельного покрытия из теса (доски толщ. 22 мм)-180 м²
- Устройство деревянного наката в чердачном перекрытии помещения прихожей-12 м²
- Устройство теплоизоляции из минплиты 100 мм-12 м²
- Восстановление верхнего слоя тесовой кровли (обрезные, строганные доски 25х200 мм)-180 м²
- Пропитка теса льняной олифой за 3 раза-360 м²
- Пропитка теса льняной олифой за 3 раза-600 м²
- Покрытия. Антисептирование-600 м²
- Расчистка фасада , шлифовка-173 м²
- Стены. Ремонт конопатки-180 м
- Пропитка всех деревянных конструкций и деталей фасада льняной олифой за 3 раза-173 м²
- Полный демонтаж деревянной обрешетки (деревянный брус 50х50 мм)-4 м²
- Устройство новой обрешетки из бруса 50х50 мм-0,05 м³
- Восстановление верхнего слоя тесовой кровли (обрезные, строганные доски 25х200 мм)-4 м²
- Зачистка от старой краски площадок и ступеней-6 м²
- Пропитка всех конструкций, теса, перил, балясин и ступеней льняной олифой за 3 раза-35 м²
- Высококачественная окраска ступеней масляной краской-3 м²
- Подготовка деревянных поверхностей: зачистка от деградированной краски, шлифовка-120 м²
- Пропитка досок и балок льняной олифой за 3 раза-120 м²
- Покрытие по проолифленной поверхности лаком за 2 раза-120 м²
- Частичная расчистка оштукатуренной поверхности стен-50 м²
- Левкас поверхности стен по синтетической сетке-100 м²
- Окраска стен (высококачественная) поливинилацетатными водоэмульсионными красками с добавлением пигментов-240 м²
- Замена оконных рам (размеры - 1,05х1,5 м) -Переплеты оконные остекленные. Снятие-50,4 м²
- Переплеты оконные неостекленные створные. Установка-32 шт
- Полотна дверные. Ремонт со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4-9 брус
- Ремонт внутренних одностворчатых деревянных дверей размерами 1,0х2,1 м. Полотна дверные. Снятие-6,3 м²
- Покраска дверей лаком на натуральной основе-11 м²

- Грунтовка деревянных оконных блоков льняной олифой за 3 раза-48м²
- Устройство песчаного слоя-20м³
- Ремонт покрытия дорожек и площадок из тротуарной плитки (брусчатки) .
Устройство сзаполнением швов песком-200м²
- Изготовление ворот-1,1м³
- Обработка бесцветным огнезащитным препаратом элементов деревянного забора, ворот икалитки-400м²
- Покраска ограждения и ворот льняной олифой за 3 раза-400м²

Предлагаем фотографий выполненных научно-реставрационных работ на объекте:

Реставрационные работы в интерьере.
Процесс Демонтажа деревянного перекрытия
Выравнивание накрененных колони с укреплением
По Мечети







Реставрационные работы фасадов.
Расчистка фасада и резных элементов, шлифовка





Заделка сквозных отверстий и швов деревянными протезами



**Пропитка всех деревянных конструкций и деталей фасада льняной олифой за 3
раза**





Левкас и окраска поверхности стен



Зачистка от старой краски площадок и ступеней



Переплеты оконные нестекленные створные



Замена прогнивших досок перекрытия



Частичный ремонт оконных ставен



Реставрационные работы кровли



Благоустройство территории



