

**Бокей ордасы: Здание больницы  
(Мемориальный музей здравоохранения), 1852 г.  
(научно-реставрационные работы, Западно-Казахстанская область)  
Основные требования к научно-реставрационным работам по  
договору № 60 на выполнение государственного задания от «23» апреля 2021**

2.

- ремонтные работы кровли;
- устройство крыльца и козырька;
  - облицовка цоколя;
- обшивка наружных стен декоративными панелями;
- реставрационные работы интерьера.

**Сметная стоимость научно-реставрационных работ 24 060 000  
тенге.**

*Сумма выполненного объема с начало года: 0 тенге. (0 %)*

*На текущий период: 24 060 000 тенге (100 %)*

*Остаток: 0 тенге (0 %)*

**В акте приемки выполненных работ №1 за октябрь-ноябрь 2021  
года (на текущий период) включены нижеследующие виды и объемы  
научно-реставрационных работ:**

1. Демонтаж существующего покрытия крылец
2. Ремонт существующей стропильной системы
3. Покрытие кровли крылец из металлических листов
  4. Устройство декоративных подзоров
  5. Устройство бетонного основания крыльца
  6. Демонтаж деревянной обшивки стен
  7. Монтаж обшивки стен из блок хауза
  8. Замена оконных переплетов
  9. Замена наружных дверей
10. Ремонт штукатурки стен и потолка с окраской
  11. Демонтаж и монтаж деревянных полов
  12. Окрасочные работы
13. Электроснабжение внутренних помещений
14. Устройство системы отопления

Демонтаж обшивки стен





Ремонт штукатурки стен





Разборка козырьков





Вскрытие полов






Обшивка стен






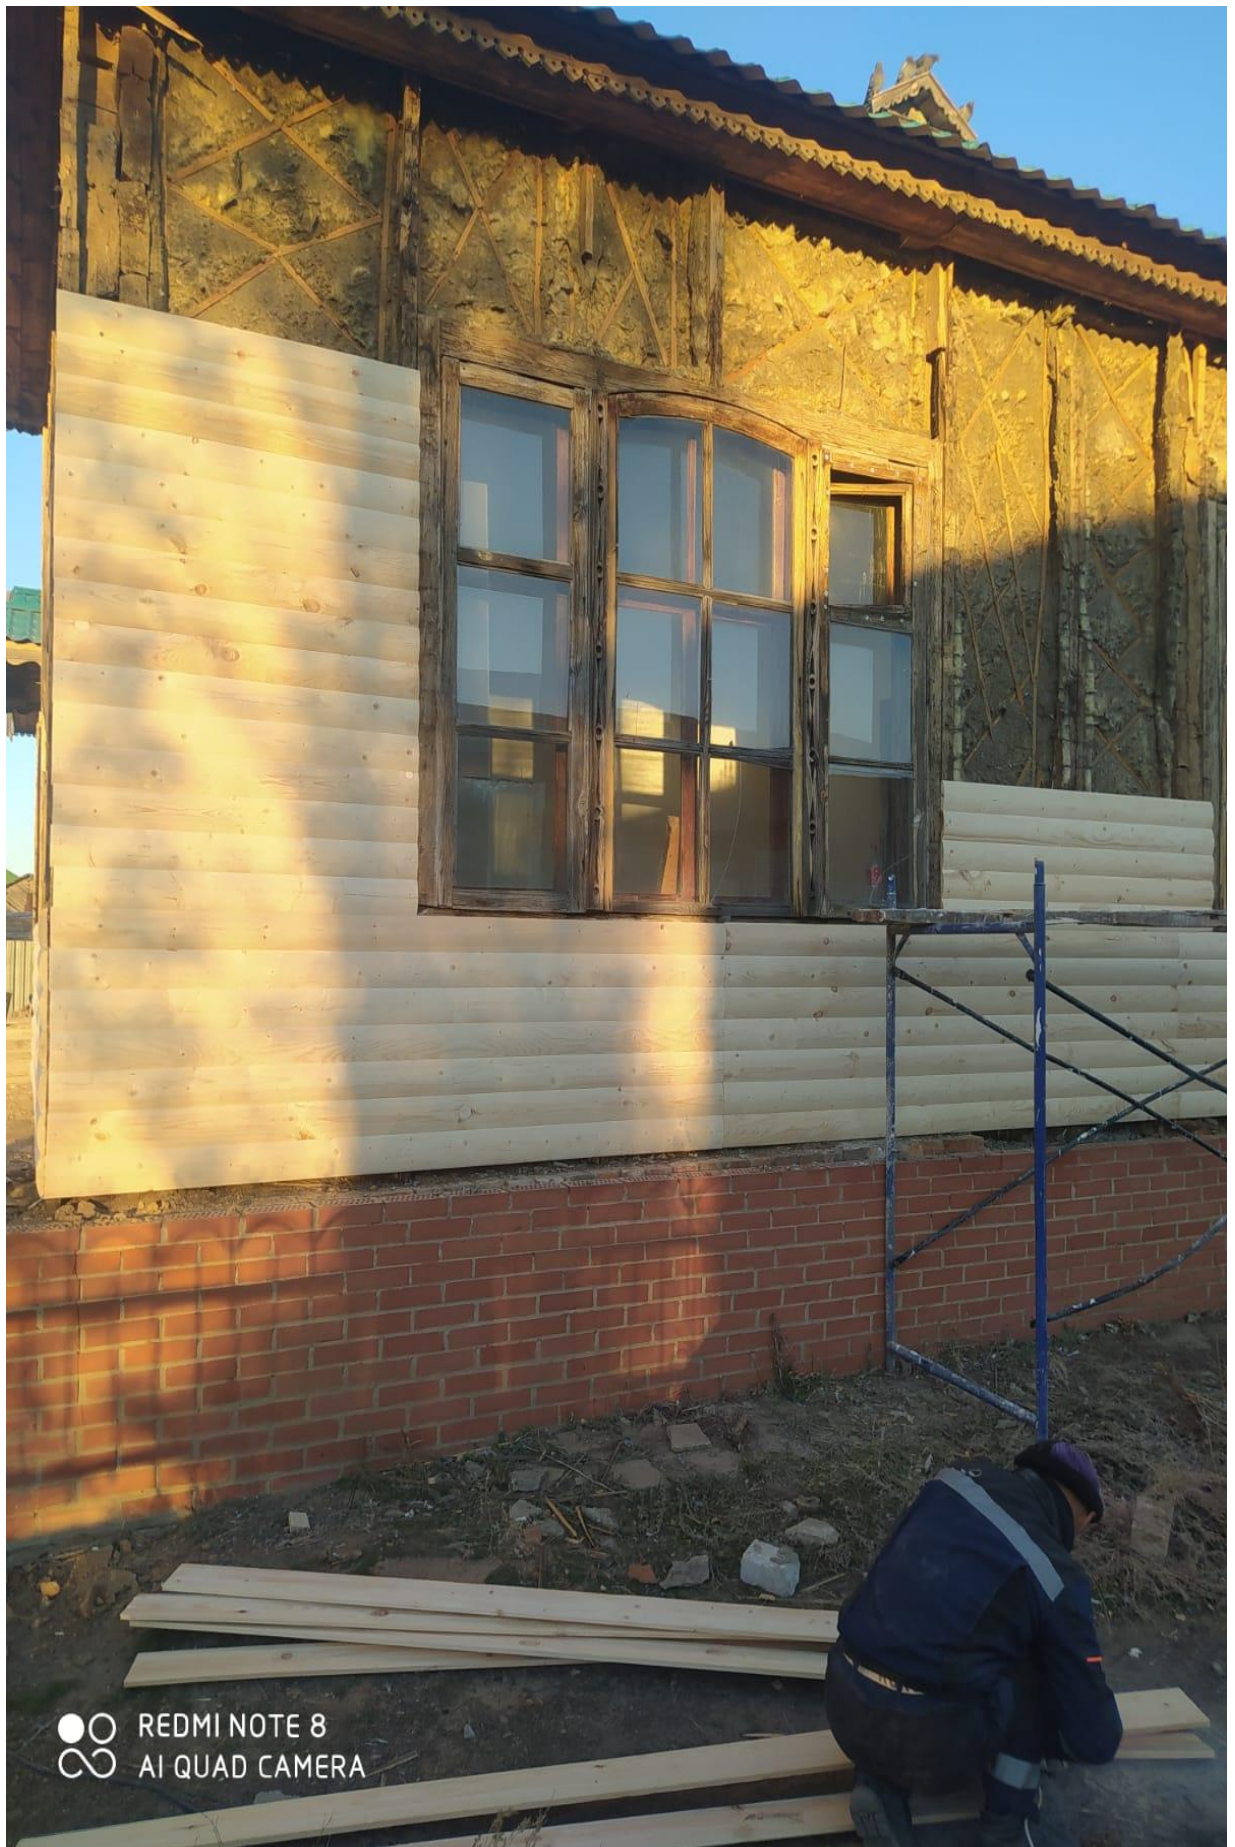

● ○ REDMI NOTE 8  
∞ AI QUAD CAMERA





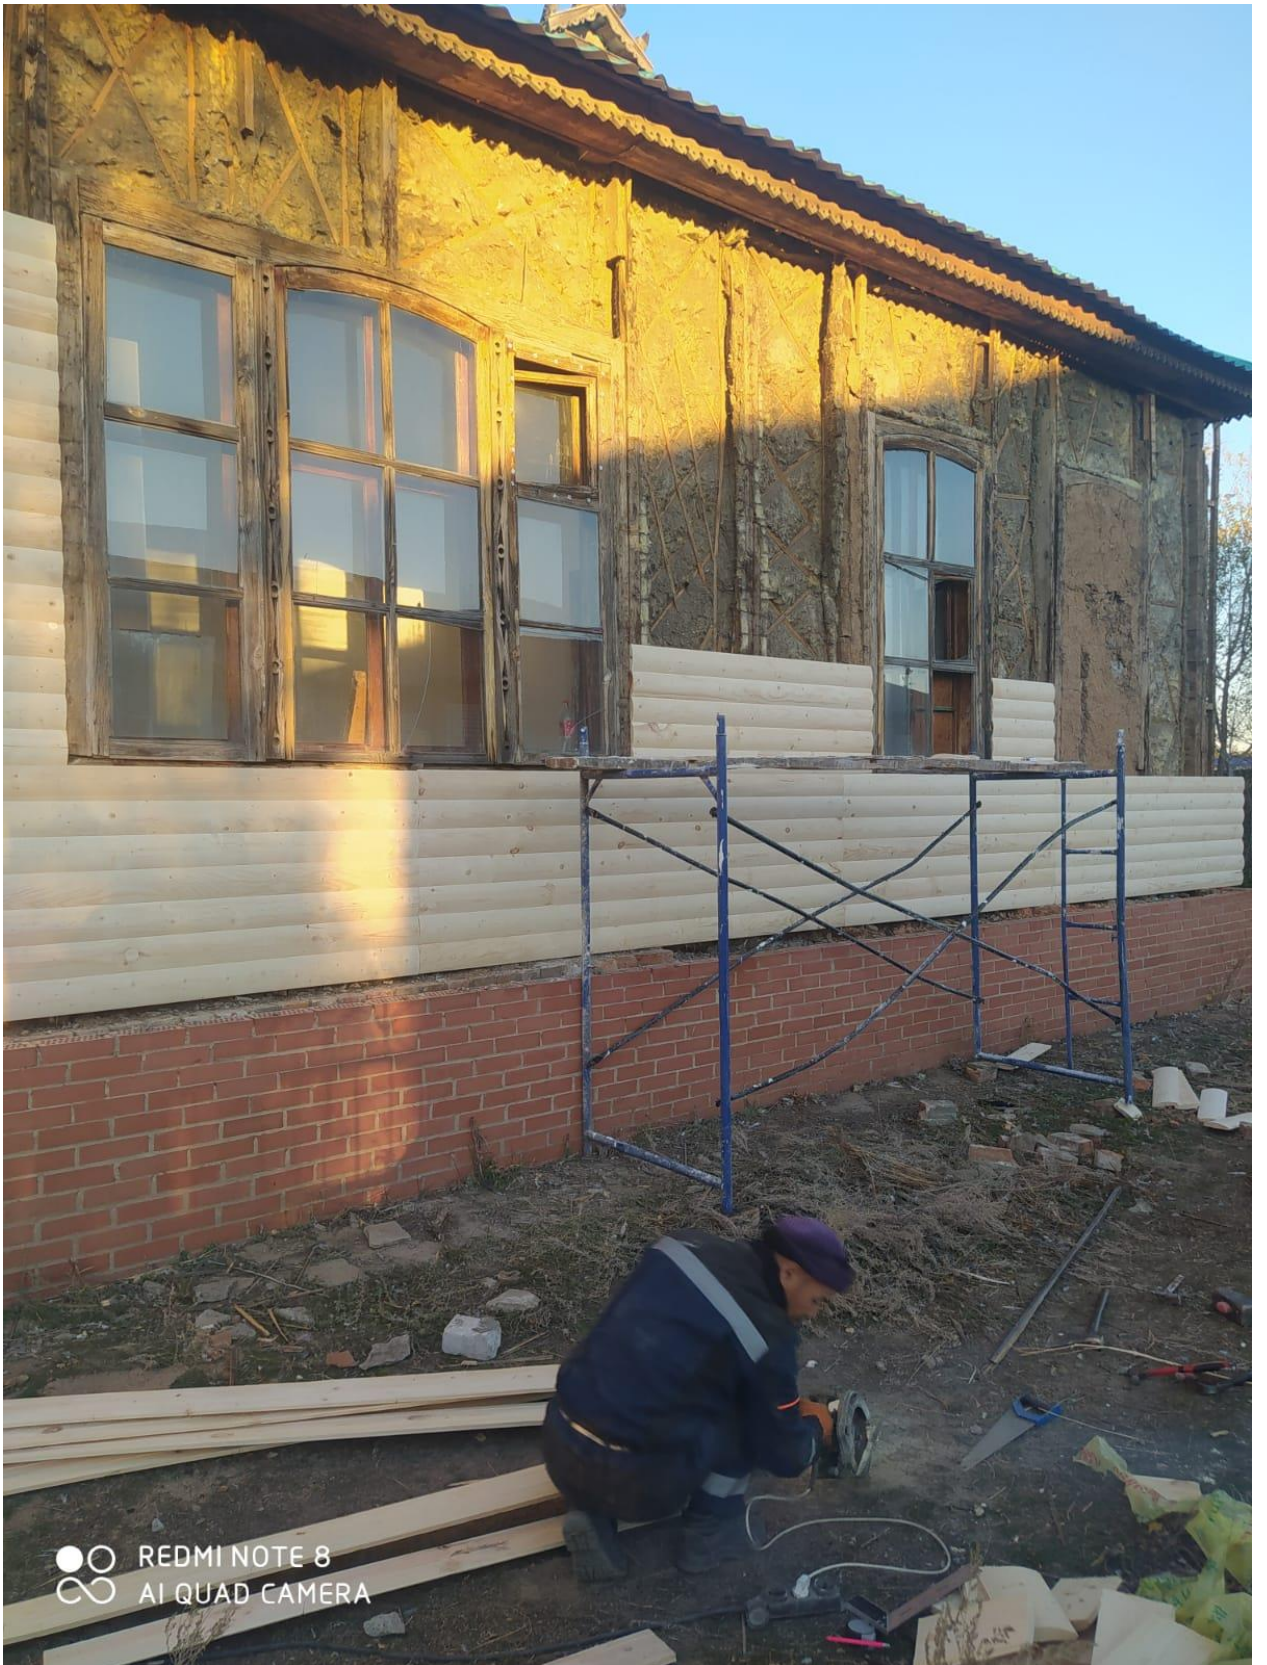

Обшивка стен блок хаузем

Ремонт штукатурки стен и потолков





## Отделка стен



Пропитка стен





Монтаж системы отопления



## Устройство деревянных полов









